



Banedanmarks Netredegørelse 2028 – Bilag 3.5B

Bilag 3.5B

Indhold

Side

1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen


3

TIB 1 – 35

4 - 15

Fjernbanen

Netredefølrelse 2028 - overblik 2029

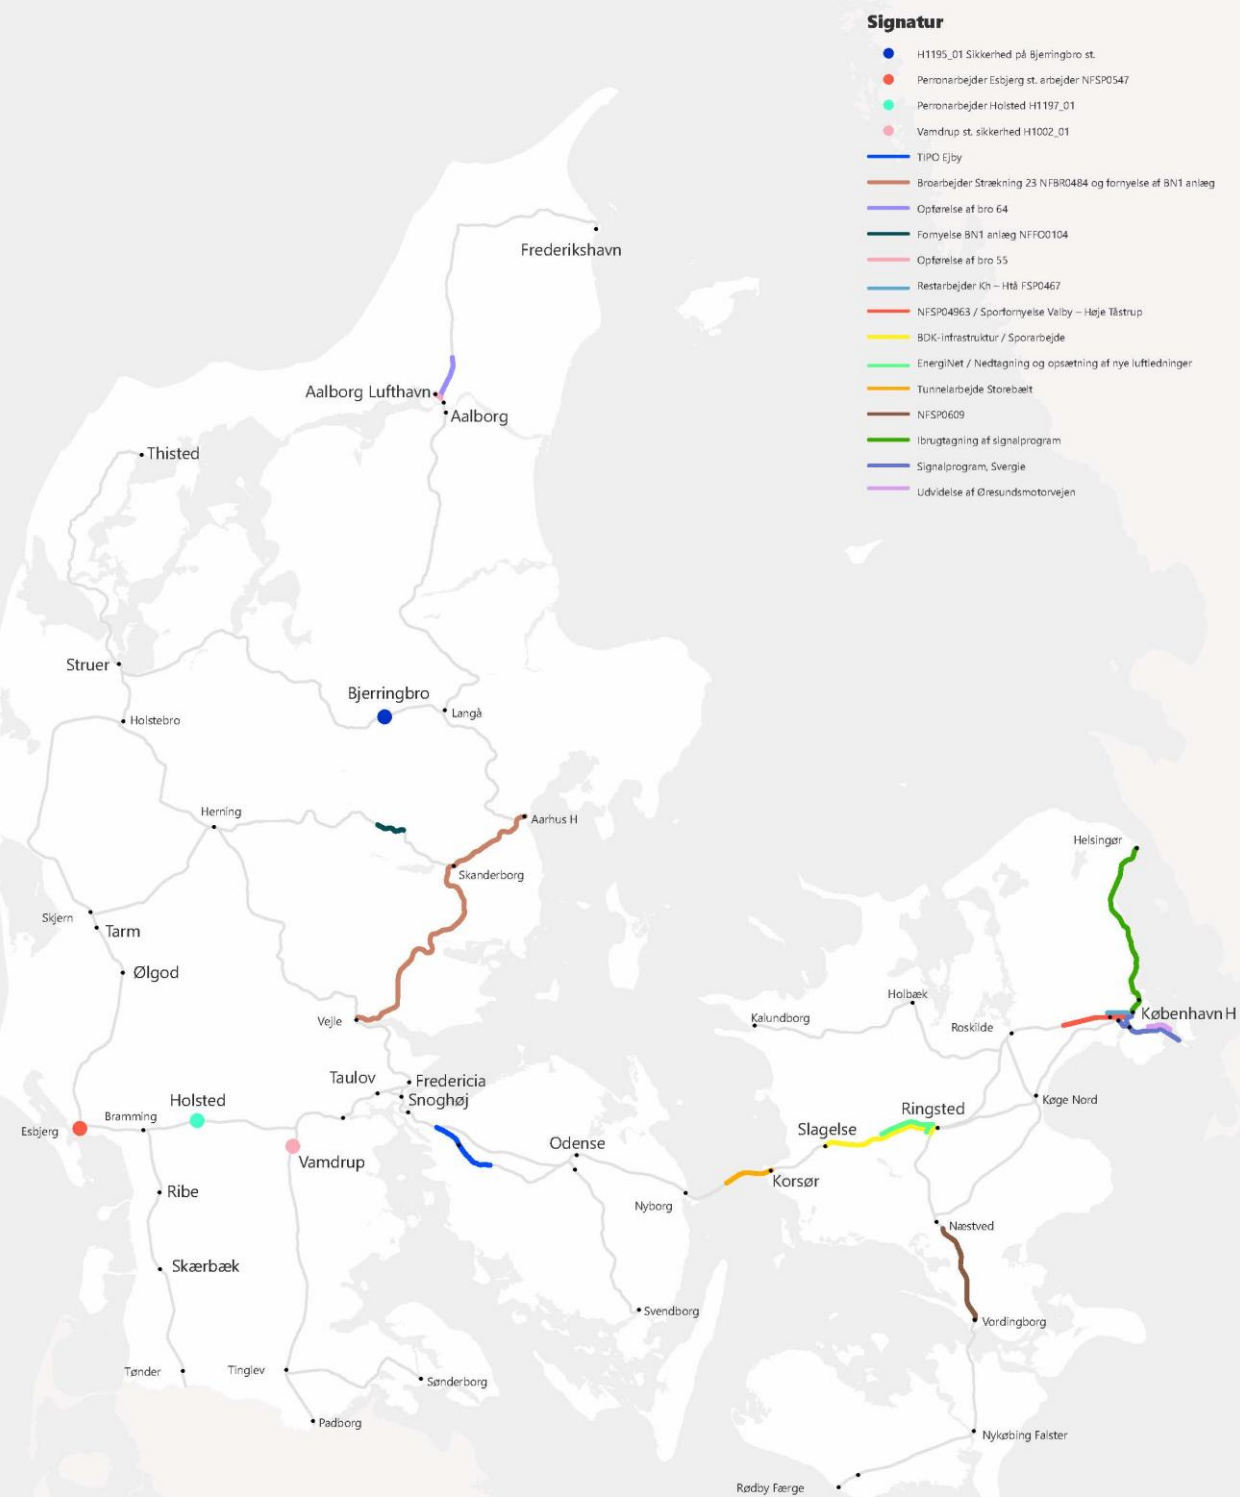

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	København – (Hvidovre Fjern)	FSP0467 Restarbejder København – Høje Tåstrup	Restarbejder - afvanding	2 døgn og 8 timer		29.03 kl. 20:00 – 01.04 kl. 04:00	Spærring spor 6 omkring sporskifte 301 og højre spor mod Hvidovre Fjern	Banedanmark	Medium
2	1	(København) – (Hvidovre Fjern)	FSP0467 Restarbejder København – Høje Tåstrup	Restarbejder København – Hvidovre Fjern / Hvidovre Fjern - København - afvanding	2 døgn og 8 timer		07.06 kl. 20:00 – 10.06 kl. 04:00	Totalspærring af strækningen København – Hvidovre Fjern / Hvidovre Fjern - København	Banedanmark	Medium
3	1	(København) – (Hvidovre Fjern)	FSP0467 Restarbejder København – Høje Tåstrup	Restarbejder København – Hvidovre Fjern / Hvidovre Fjern - København - afvanding	2 døgn og 8 timer		14.06 kl. 20:00 – 17.06 kl. 04:00	Totalspærring af strækningen København – Hvidovre Fjern / Hvidovre Fjern - København	Banedanmark	Medium
4	1	(Glostrup) – (Høje Tåstrup)	NFSP04963 / Sporfornyelse Valby – Høje Tåstrup	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen, samt logistikkanal	2 døgn og 6 timer		09.02 kl. 22:30 - 12.02 kl. 04.30	Højre spor Glostrup – Høje Tåstrup spærret.	Banedanmark	Medium
5	1	(Glostrup) – (Høje Tåstrup)	NFSP04963 / Sporfornyelse Valby – Høje Tåstrup	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen, samt logistikkanal	2 døgn og 6 timer		16.02 kl. 22:30 – 19.02 kl. 04.30	Højre spor Glostrup – Høje Tåstrup spærret.	Banedanmark	Medium
6	1	(Glostrup) – (Høje Tåstrup)	NFSP04963 / Sporfornyelse Valby – Høje Tåstrup	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen, samt logistikkanal	10 døgn og 6 timer og 30 minutter		23.03 kl. 20:30 – 03.04 kl. 04:00	Højre spor Glostrup – Høje Tåstrup spærret.	Banedanmark	High
7	1	(Hvidovre Fjern) – (Glostrup)	NFSP04963 / Sporfornyelse Valby – Høje Tåstrup	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen, samt logistikkanal	3 døgn og 6 timer		18.05 kl. 22:30 – 22.05 kl. 04:30	Højre spor Hvidovre Fjern – Glostrup spærret.	Banedanmark	Medium
8	1	Glostrup	NFSP04963 / Sporfornyelse Valby – Høje Tåstrup	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen	7 døgn		18.05 kl. 22:30 – 25.05 kl. 22:30	Glostrup spor 2 mellem PU-signaler E2 og H2 spærret	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
9	1	(København) – (Hvidovre Fjern)	NFSP04963 / Sporformyelse Valby – Høje Tåstrup	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen, samt logistikkanal	2 døgn og 6 timer		08.06 kl. 22:30 – 11.06 kl. 04:30	Højre spor København – Hvidovre Fjern spærret	Banedanmark	Medium
10	1	(København) – (Glostrup)	NFSP04963 / Sporformyelse Valby – Høje Tåstrup	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen, samt logistikkanal	13 døgn og 6 timer		15.07 kl. 22:30 – 29.07 kl. 20:30	Højre spor København – Hvidovre Fjern - Glostrup spærret	Banedanmark	High
11	1	Ringsted – Slagelse	BDK-infrastruktur	Sporarbejde	50 døgn	Medio februar – medio april		Enkeltsporsdrift Slagelse - Sorø La80 i nabospor min. 4000 meter	Banedanmark	Major
12	1	(Ringsted)- (Sorø)	EnergiNet	Nedtagning og opsætning af nye luftledninger	3 døgn	1. kvartal		Totalspærring Ringsted - Sorø	EnergiNet	Medium
13	1	(Sprogø) – (Korsør)	Udskiftning af brandvandsrør i hele tunnelen	Tunnelarbejde	14 døgn		12.03 -25.03	Spærring af 1.Hsp Sprogø - Korsør uafbrudt i 14 døgn	Sund & Bælt	High
14	1	(Sprogø) – (Korsør)	Udskiftning af brandvandsrør i hele tunnelen	Tunnelarbejde	14 døgn		09.04 -22.04	Spærring af 2.Hsp Korsør - Sprogø uafbrudt i 14 døgn Obs! Der er behov for 14 dage mellem spærring af 1.Hsp og 2.Hsp	Sund & Bælt	High
15	1	(Kavslunde) – (Aarup)	TIPO Ejby	Etablering af elevator	5 døgn		29.03 – 03.04	Totalspærring mellem Kavslunde - Aarup	Banedanmark	Medium
16	1	(Kavslunde) – (Aarup)	TIPO Ejby	Etablering af elevator	2 døgn og 8 timer		08.06 – 11.06	Totalspærring mellem Kavslunde - Aarup	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
17	1	(Kavslunde) – (Aarup)	TIPO Ejby	Etablering af elevator	2 døgn og 8 timer		29.06 – 02.07	Totalspærring mellem Kavslunde - Aarup	Banedanmark	Medium
18	1	(Kavslunde) – (Aarup)	TIPO Ejby	Etablering af elevator	2 døgn og 8 timer		06.07 – 09.07	Totalspærring mellem Kavslunde - Aarup	Banedanmark	Medium
19	2	(Næstved) – (Vordingborg)	NFSP0609	Stadie 1 Manuelle sporarbejder	48 døgn og 23 timer		05.03 kl. 06:00 – 23.04 kl. 06:00	Enkeltspørsdrift, 2. hovedspor Næstved – Vordingborg spærret LA120 i nabospor	Banedanmark	Major
20	2	(Næstved) – (Vordingborg)	NFSP0609	Stadie 2 Manuelle sporarbejder ved Mogenstrup Brokiler	5 døgn og 3 timer og 30 minutter		29.03 kl. 00:30 – 03.04 kl. 04:00	Totalspærring Næstved - Vordingborg	Banedanmark	Major
21	2	(Mogenstrup) – (Næstved)	NFSP0609	Stadie 3 Manuelle sporarbejder	45 døgn		23.04 kl.06:00 – 07.06 kl.06:00	Enkeltspørsdrift, 1. hovedspor Mogenstrup - Næstved spærret LA120 i nabospor	Banedanmark	Major
22	2	(Vordingborg) – (Mogenstrup)	NFSP0609	Stadie 3 Manuelle sporarbejder	45 døgn		23.04 kl.06:00 – 07.06 kl.06:00	Enkeltspørsdrift, 1. hovedspor Vordingborg - Mogenstrup spærret LA120 i nabospor	Banedanmark	Major
23	2	(Næstved) – (Vordingborg)	NFSP0609	Stadie 4 Brokiler og tværgående ledninger	3 døgn og 3 timer og 30 minutter		19.05 kl.00:30 – 22.05 kl.04:00	Totalspærring Næstved - Vordingborg	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
24	2	(Næstved) – (Vordingborg)	NFSP0609	Stadie 5 Banketafgravning	17 døgn		07.06 kl.06:00 – 24.06 kl.06:00	Enkeltsporsdrift, 2. hovedspor Næstved – Vordingborg spærret LA120 i nabospor	Banedanmark	Major
25	2	(Mogenstrup) – (Næstved)	NFSP0609	Stadie 6 Banketafgravning	15 døgn		24.06 kl.06:00 – 09.07 kl.06:00	Enkeltsporsdrift, 1. hovedspor Mogenstrup – Næstved spærret LA120 i nabospor	Banedanmark	Major
26	2	(Vordingborg) – (Næstved)	NFSP0609	Stadie 6 Banketafgravning	15 døgn		24.06 kl.06:00 – 09.07 kl.06:00	Enkeltsporsdrift, 1. hovedspor Vordingborg – Mogenstrup spærret LA120 i nabospor	Banedanmark	Major
27	2	(Mogenstrup) – (Næstved)	NFSP0609	Stadie 9 Maskinelle arbejder	74 døgn		01.08 kl.06:00 – 14.10 kl.06:00	Enkeltsporsdrift, 1. hovedspor Mogenstrup – Næstved spærret LA80 på 4000 meter i nabospor	Banedanmark	Major
28	2	(Vordingborg) – (Næstved)	NFSP0609	Stadie 9 Maskinelle arbejder	74 døgn		01.08 kl.06:00 – 14.10 kl.06:00	Enkeltsporsdrift, 1. hovedspor Vordingborg – Mogenstrup spærret LA80 på 4000 meter i nabospor	Banedanmark	Major
29	2	(Lundby) – (Næstved)	NFSP0609	Stadie 10 Maskinelle arbejder	10 døgn		13.08 kl.06:00 – 23.08 kl.06:00	Enkeltsporsdrift, 1. hovedspor Mogenstrup spærret LA80 på 4000 meter i nabospor OBS: Ingen adgang til/fra DSB-værkstedet i Mogenstrup	Banedanmark	Major
30	2	(Næstved) – (Vordingborg)	NFSP0609	Stadie 13 Maskinelle arbejder	75 døgn og 1 time		14.10 kl.06:00 – 28.12 kl.06:00	Enkeltsporsdrift, 2. hovedspor Næstved – Vordingborg spærret LA80 på 4000 meter i nabospor	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
31	2	(Vordingborg) – (Næstved)	NFSP0609	Stadie 14 Skærvesupplering Slutjustering efter Stadie 9	Natspærring 10 x 8 timer		22.11 kl.22:00 – 02.12 kl.06:00	Totalspærring da nabospor også er spærret, 1. hovedspor Vordingborg – Næstved spærres	Banedanmark	Major
32	10	Hellerup – Helsingør	Signalprogrammet	Ibrugtagning af signalprogram	9 døgn og 6 timer		06.07 kl. 20:00 – 16.07 kl. 02:00	Totalspærring Hellerup - Helsingør	Banedanmark	High
33	10	Østerport – (Hellerup)	Signalprogrammet	Ibrugtagning af signalprogram	14 døgn		16.07 kl. 04:00 – 30.07 kl. 04:00	Totalspærring Østerport - Hellerup	Banedanmark	High
34	11	(København H) / (Vigerslev) – Peberholm	Signalprogrammet Sverige	Opdatering af Dansk signalprogram ifm. Testkørsler på Øresundsbroen	2 døgn	Januar		Totalspærring af hele strækningen og Øresundsforbindelsen	Øresundsbroen / Trafikverket	Medium
35	11	(København H) / (Vigerslev) – Peberholm	Signalprogrammet Sverige	Opdatering af Dansk signalprogram ifm. ibrugtagning af Svensk system på Øresundsforbindelsen	4 døgn	Juli		Totalspærring af hele strækningen og Øresundsforbindelsen	Øresundsbroen / Trafikverket	Medium
36	11	Kastrup Lufthavn	Udvidelse af Øresundsmotorvej	Etablering af spuns	55 døgn		07.01 – 03.03	Spærring af spor 11 og 12	Sund & Bælt	Major
37	11	Kastrup Lufthavn	Udvidelse af Øresundsmotorvej	Fundament til sti bro	20 døgn		02.04 – 22.04	Spærring af spor 11 og 12	Sund & Bælt	High
38	11	Kastrup Lufthavn	Udvidelse af Øresundsmotorvej	Forskalling ifm. brodæk	10 døgn		07.05 – 18.05	Spærring af spor 11 og 12	Sund & Bælt	High
39	11	Kastrup Lufthavn	Udvidelse af Øresundsmotorvej	Støbning af brodæk (30 dage efter forskalling)	7 døgn		18.06 – 25.06	Spærring af spor 11 og 12	Sund & Bælt	High

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
40	11	Kastrup Lufthavn	Udvidelse af Øresundsmotorvej n	Af forskalling af brodæk (30 dage efter støbning) Etablering af trapper og aptering	15 døgn		06.08 – 27.08	Spærring af spor 11 og 12	Sund & Bælt	High
41	11	Kastrup Lufthavn	Udvidelse af Øresundsmotorvej n	Afsluttende arbejde ifm. sti bro	7 døgn		05.11 – 11.11	Spærring af spor 11 og 12	Sund & Bælt	High
42	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		13.04 – 16.04	Totalspærring Horsens – Skanderborg	Banedanmark	Medium
43	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		20.04 – 23.04	Totalspærring Horsens – Skanderborg	Banedanmark	Medium
44	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		27.04 – 30.04	Totalspærring Horsens - Skanderborg	Banedanmark	Major
45	23	(Skanderborg) – (Hovedgård)	NFBR0484	Broarbejder	26 døgn		30.04 – 25.05	Enkeltspørsdrift, 1. hovedspor spærret imellem Skanderborg og Hovedgård, LA 40/80 i nabospor 2 forskellige steder	Banedanmark	Major
46	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		25.05 – 28.05	Totalspærring Horsens - Skanderborg	Banedanmark	Major
47	23	(Hovedgård) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	26 døgn		28.05 – 22.06	Enkeltspørsdrift, 2. hovedspor spærret imellem Skanderborg og Hovedgård, LA 40/80 i nabospor 2 forskellige steder	Banedanmark	Major
48	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		22.06 – 25.06	Totalspærring Horsens - Skanderborg	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
49	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	26 døgn		25.06 – 20.07	2. hovedspor spærret imellem Horsens og Skanderborg, LA 40 i nabospor ved 1 bro	Banedanmark	Major
50	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		20.07 – 23.07	Totalspærring Horsens – Skanderborg	Banedanmark	Major
51		(Skanderborg) – (Horsens)	NFBR0484	Broarbejder	26 døgn		23.07 – 17.08	Enkeltsporsdrift, 1. Hovedspor spærret mellem Skanderborg og Horsens, LA 40 i nabospor ved 1 bro	Banedanmark	Major
52	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		17.08 – 20.08	Totalspærring Horsens - Skanderborg	Banedanmark	Major
53	23	(Hovedgård) – (Horsens)	NFBR0484	Broarbejder	26 døgn		20.08 – 14.09	Enkeltsporsdrift, 1. hovedspor Hovedgård – Horsens spærret, LA 40 i nabospor ved 1 bro	Banedanmark	Major
54	23	(Skanderborg) – (Horsens)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		14.09 – 17.09	Totalspærring Horsens - Skanderborg	Banedanmark	Major
55	23	(Horsens) – (Hovedgård)	NFBR0484	Broarbejder	26 døgn		17.09 – 12.10	Enkeltsporsdrift, 2. hovedspor Horsens – Hovedgård spærret, LA 40 i nabospor ved 1 bro	Banedanmark	Major
56	23	(Horsens) – (Skanderborg)	NFBR0484	Broarbejder	2 døgn og 8 timer		12.10 – 15.10	Totalspærring Horsens - Skanderborg	Banedanmark	Major
57	23	Aarhus H	NFBR0484	Broarbejder	26 døgn		16.07 – 10.08	Spærring af spor 106e kørestrømsafbrydelse område R1	Banedanmark	Major
58	23	(Vejle) – (Hedensted)	NFFO0121	Fornyelse BN1 anlæg	21 døgn	Juni - August		Et hovedspor spærret	AGK Geoteknik & Klima	High

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
59	23	(Hedensted) – (Horsens)	NFFO0110	Fornyelse BN1 anlæg	14 døgn	Juni - August		Et hovedspor spærret	AGK Geoteknik & Klima	High
60	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64	Opførelse af ny bro	2 døgn og 8 timer		05.01 kl. 20:00 – 08.01 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
61	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64	Opførelse af ny bro	2 døgn og 8 timer		26.01 kl. 20:00 – 29.01 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
62	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64	Opførelse af ny bro	2 døgn og 8 timer		02.02 kl. 20:00 – 05.02 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
63	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64	Opførelse af ny bro	2 døgn og 8 timer er		09.02 kl. 20:00 – 12.02 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
64	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64	Opførelse af ny bro	2 døgn og 8 timer		20.04 kl. 20:00 – 23.04 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
65	26	Vamdrup	H1002_01	Sikkerhed på Vamdrup station	21 døgn		07.05 - 27.05	Spor 1 spærret Alle tog benytter spor 2 og 3 Kun passagerudveksling i spor 2	Banedanmark	High
66	26	Vamdrup	H1002_01	Sikkerhed på Vamdrup station	21 døgn		04.06 - 24.06	Spor 1 og 2 spærret Ingen passagerudveksling i Vamdrup Alle tog benytter spor 3 Begrænsning på godstog til Vamdrup	Banedanmark	High

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
67	26	Vamdrup	H1002_01	Sikkerhed på Vamdrup station	8 døgn 8 timer		14.07 - 22.07	Spor 1, 2 og 3 spærret totalspærring	Banedanmark	High
68	26	Padborg	C60531/ NPTS002	Elevator og perronhævning	63 døgn	Februar – April		Spor 1, 2 og 3 spærret Ingen passagerudveksling i Padborg Mulig reduktion i godstrafik	Banedanmark	Major
69	26	Padborg	C60531/ NPTS002	Elevator og perronhævning	56 døgn	April – Juni		Spor 2 og 3 spærret Kun et passagertog kan ekspederes ad gangen Mulig reduktion i godstrafik	Banedanmark	Major
70	29	(Bramming) – (Vejen)	H1197_01	Perronarbejder Holsted	28 døgn		18.06 kl. 00:00 – 15.07 kl. 24:00	Spor 2 kan ikke benyttes, alle tog benytter spor 1.	Banedanmark	High
71	29	Esbjerg – (Bramming)	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	5 døgn		17.06 kl. 20:00 – 22.06 kl. 20:00	Spærring af 2. hovedspor fra mærke Es-031 til mærke Es-202 Spor 2, 3, 4 og 5 spærret i Es Det er ikke muligt at komme på havnen	Banedanmark	Major
72	29	Esbjerg – (Bramming)	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	2 døgn og 8 timer		22.06 kl. 20:00 – 25.06 kl. 04:00	Totalspærring Esbjerg station	Banedanmark	Major
73	29	Esbjerg	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	21 døgn		25.06 kl. 04:00 – 16.07 kl. 04:00	Spor 2, 3, 4 og 5 spærret i Es Det er ikke muligt at komme på havnen	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
74	29	Esbjerg	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	21 døgn		16.07 kl. 04:00 – 06.08 kl. 04:00	Spor 3, 4 og 5 spærret i Es Det er ikke muligt at komme på havnen	Banedanmark	Major
75	29	Esbjerg	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	21 døgn		06.08 kl. 04:00 – 27.08 kl. 04:00	Spærring af spor 0 og 1	Banedanmark	Major
76	31	Esbjerg – (Guldager)	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	5 døgn		17.06 kl. 20:00 – 22.06 kl. 20:00	Spærring af 2. hovedspor fra mærke Es-031 til mærke Es-202 Spor 2, 3, 4 og 5 spærret i Es Det er ikke muligt at komme på havnen Spor 6 er spærret, det er ikke muligt at komme i P-risten	Banedanmark	Major
77	31	Esbjerg – (Guldager)	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	2 døgn og 8 timer		22.06 kl. 20:00 – 25.06 kl. 04:00	Totalspærring Esbjerg station	Banedanmark	Major
78	31	Esbjerg	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	21 døgn		25.06 kl. 04:00 – 16.07 kl. 04:00	Spor 2, 3, 4 og 5 spærret i Es Det er ikke muligt at komme på havnen	Banedanmark	Major
79	31	Esbjerg	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	21 døgn		16.07 kl. 04:00 – 06.08 kl. 04:00	Spor 3, 4 og 5 spærret i Es Det er ikke muligt at komme på havnen	Banedanmark	Major
80	31	Esbjerg	NFSP0547 Esbjerg station	Perron, spor og sporskiftearbejder	21 døgn		06.08 kl. 04:00 – 27.08 kl. 04:00	Spærring af spor 0 og 1	Banedanmark	Major
81	32	Bjerringbro	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Bro og perronarbejde	23 døgn		24.04 kl. 00:00 – 16.05 kl. 24:00	Spærring af spor 1 mellem Bj009 og Bj010	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
82	32	Bjerringbro	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Bro og perronarbejde	45 døgn		17.05 kl. 00:00 – 30.06 kl. 24:00	Spærring af spor 2 mellem mærke Bj011 og mærke Bj012	Banedanmark	Major
83	32	(Viborg) – (Rødkærsbro)	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Bro og perronarbejde	8 døgn		01.07 kl. 00:00 – 08.07 kl. 24:00	Totalspærring på Bjerringbro	Banedanmark	Major
84	32	Bjerringbro	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Bro og perronarbejde	28 døgn		09.07 kl. 00:00 – 05.08 kl. 24:00	Spærring af spor 2 mellem mærke Bj011 og mærke Bj012	Banedanmark	Major
85	32	Bjerringbro	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Bro og perronarbejde	29 døgn		06.08 kl. 00:00 – 03.09 kl. 24:00	Spærring af spor 1 mellem mærke Bj009 og mærke Bj010	Banedanmark	Major
86	35	Laven - Svejbæk	NFFO0104	Fornyelse BN1 anlæg	21 døgn	Juni - september		Totalspærring Laven - Svejbæk	AGK Geoteknik & Klima	High
87	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55 og kørestrømsarbejder	2 døgn og 8 timer		15.12 kl. 20:00 – 18.12 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
88	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55 og kørestrømsarbejder	2 døgn og 8 timer		02.02 kl. 20:00 – 05.02 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
89	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		16.02 kl. 20:00 – 19.02 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
90	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		23.02 kl. 20:00 – 26.02 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
91	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		02.03 kl. 20:00 – 05.03 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
92	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer 56 timer		04.05 kl. 20:00 – 07.05 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
93	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		01.06 kl. 20:00 – 04.06 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
94	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		08.06 kl. 20:00 – 11.06 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
95	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55 og kørestrømsarbejder	2 døgn og 8 timer		06.07 kl. 20:00 – 09.07 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
96	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		13.07 kl. 20:00 – 16.07 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
97	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		03.08 kl. 20:00 – 06.08 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
