



Banedanmarks Netredegørelse 2027 – Bilag 3.5B

Bilag 3.5B

Indhold

Side

1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen


3 - 4

TIB 1 – 35

5 - 11


Fjernbanen TIB 1- 21

Netredegørelse 2027 - overblik 2028

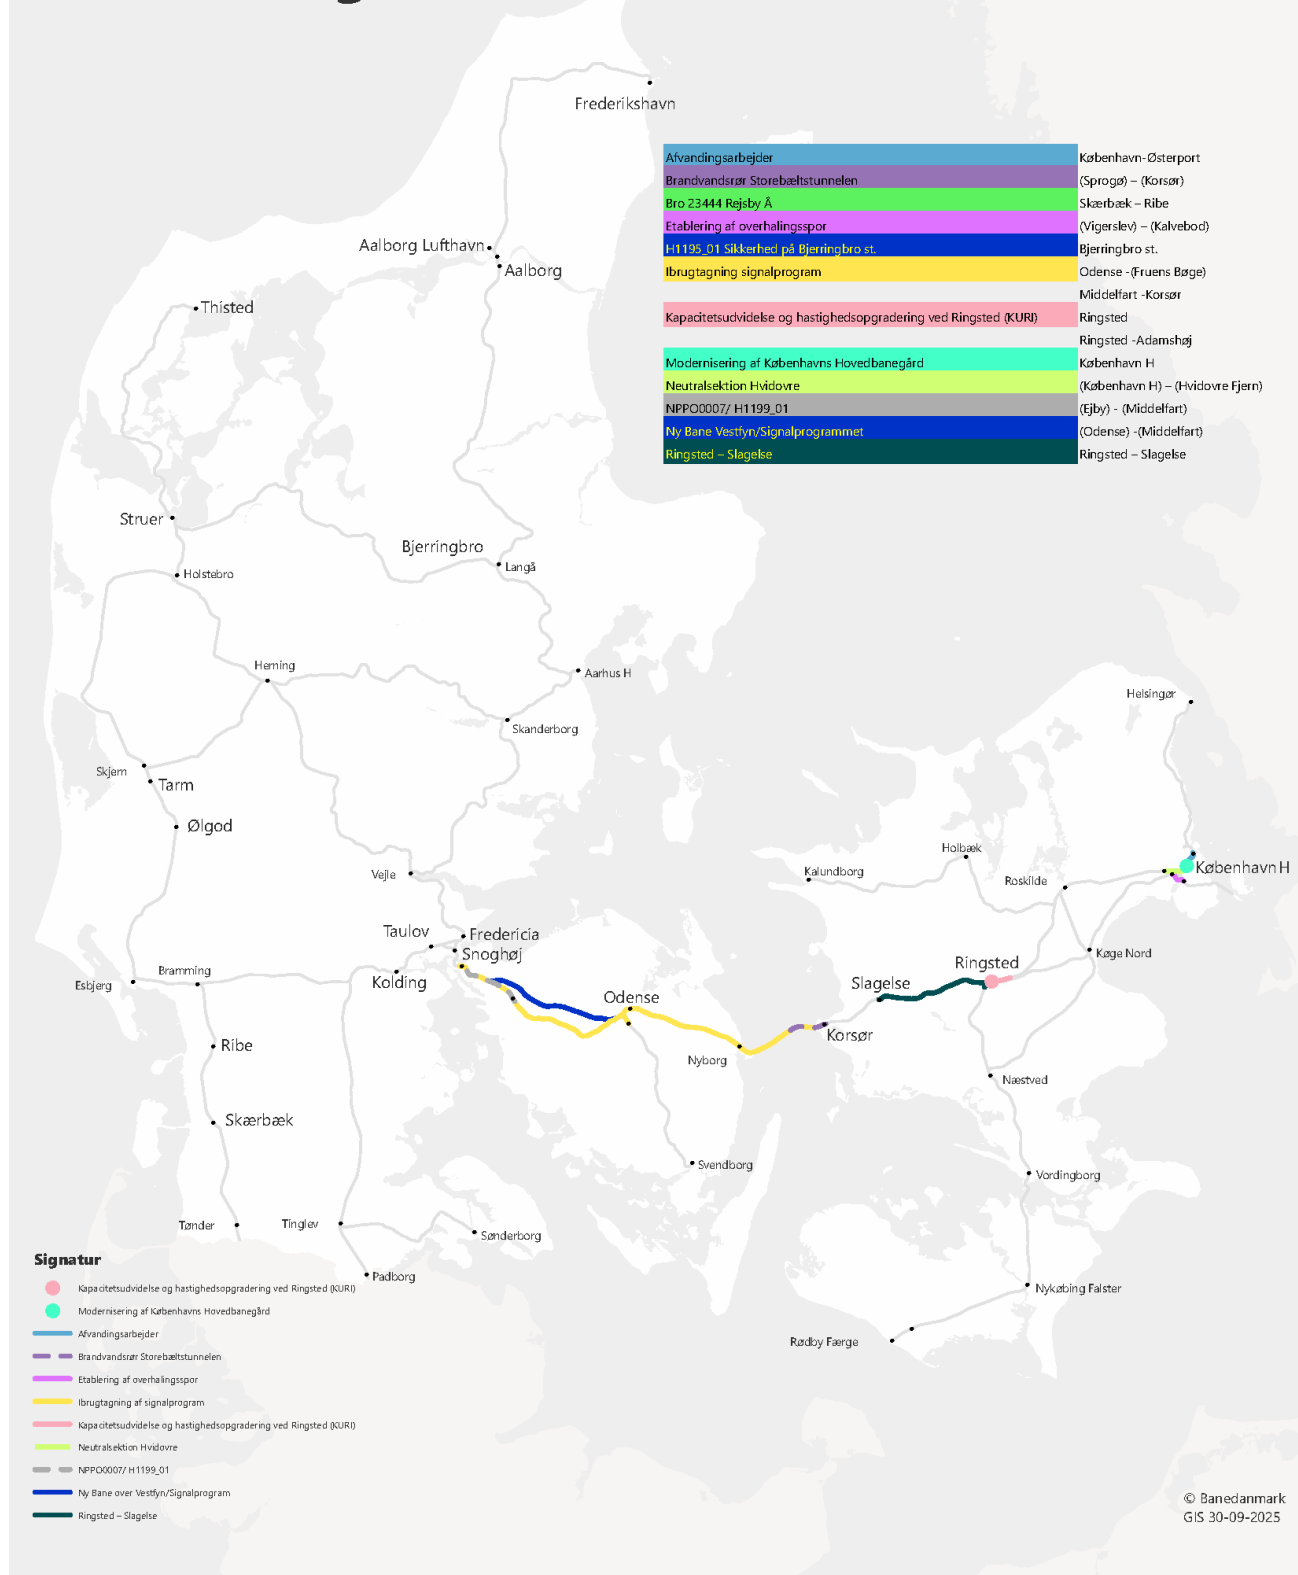

Fjernbanen TIB 25-52

Netreddegørelse 2027 - overblik 2028

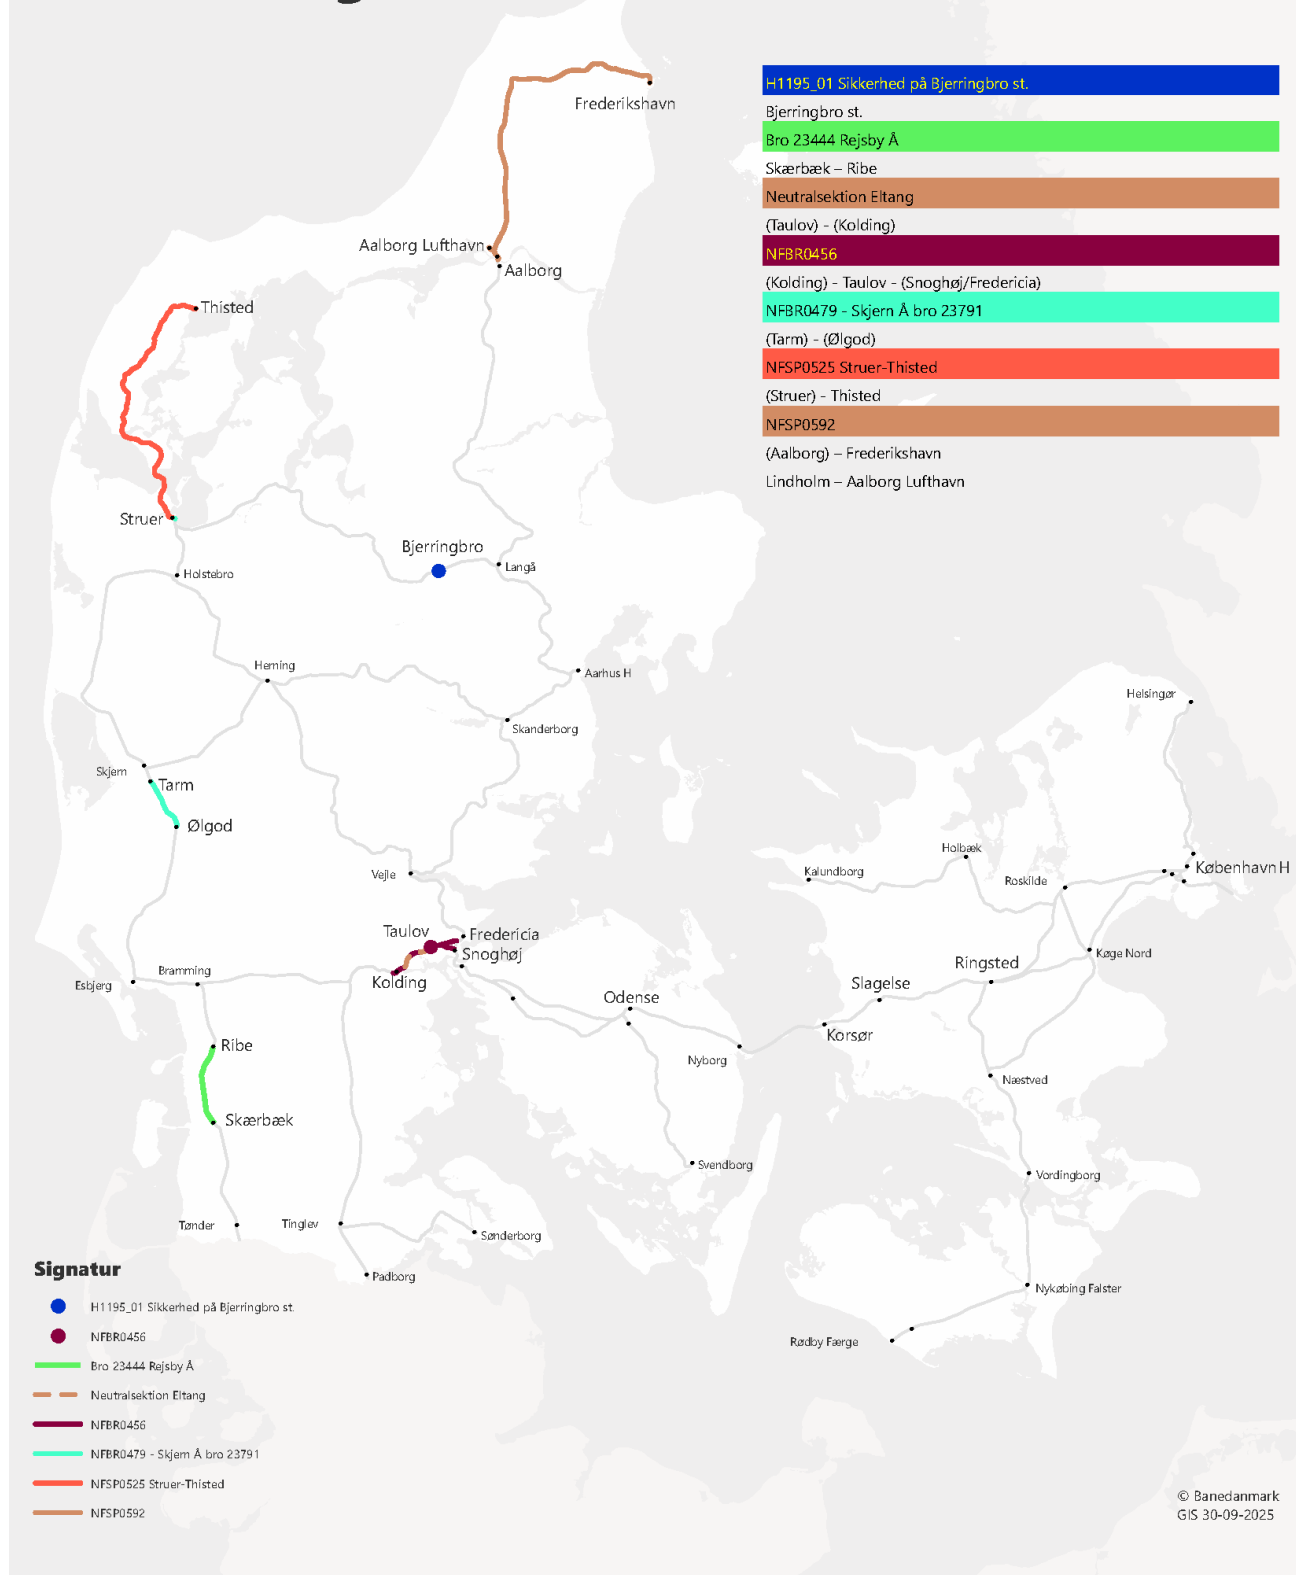

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		03.03 kl. 22:00 - 06.03 kl. 04:00	Spærring af spor 1 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
2	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		10.03 kl. 22:00 - 13.03 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
3	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		17.03 kl. 22:00 - 20.03 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
4	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		24.03 kl. 22:00 - 27.03 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
5	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		31.03 kl. 22:00 - 03.04 kl. 04:00	Spærring af spor 8 og 9 Koordineres med S-banen Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
6	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		21.04 kl. 22:00 - 24.04 kl. 04:00	Spærring af spor 1 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
7	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		28.04 kl. 22:00 - 01.05 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
8	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		05.05 kl. 22:00 - 08.05 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
9	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		12.05 kl. 22:00 - 15.05 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
10	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		19.05 kl. 22:00 - 22.05 kl. 04:00	Spærring af spor 8 og 9 Koordineres med S-banen	DSB	Medium
11	1	København H	Ny anlæg af vendespor ved Carlsberg station	Dækningsspærring til arbejdet på S-Banen, samt logistikkanal	14 døgn		03.07 – 17.07	Højre spor mellem København H og Hvidovre Fjern	Banedanmark	High
12	1	(Hvidovre Fjern) - (København H)	Neutralsektion Hvidovre	Udskiftning af neutralsektion	12 timer		22.09 kl. 19:00 - 23.09 kl. 07:00	Enkeltsporsdrift Indadgående trafik køres via Vigerslev	Banedanmark	Medium
13	1	(København H) - (Hvidovre Fjern)	Neutralsektion Hvidovre	Udskiftning af neutralsektion	12 timer		23.09 kl. 19:00 - 24.09 kl. 07:00	Totalspærring. Al trafik køres via Vigerslev.	Banedanmark	Medium
14	1	Glostrup – Høje Tåstrup	Broarbejde NFBRO4444	Betonreparationer af sporfletningsbroen i Glostrup (undersiden)	9 døgn		05.03 kl. 22.30 - 14.03 kl. 04.30	Enkeltsporsdrift + LA40 omkring arbejdsstedet	Banedanmark	Major
15	1	Høje Tåstrup - Glostrup	Broarbejde NFBRO4444	Betonreparationer af sporfletningsbroen i Glostrup (undersiden)	9 døgn		14.03 kl. 22.30 - 23.03 kl. 04.30	Enkeltsporsdrift + LA40 omkring arbejdsstedet	Banedanmark	Major
16	1	Ringsted – Fjenneslev spor 2 - Sorø	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 4	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning DSM-kørsel, justering K-ophæng	21 døgn		09.07 kl. 22.00 - 31.07 kl. 04.00	Dobbelt venstrespordrift ml. Ringsted - Sorø LA80 i Fjenneslev spor 1	Banedanmark	Major
17	1	(Sorø) – Fjenneslev	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 5	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning DSM-kørsel, justering K-ophæng	38 døgn		31.07 kl. 04.00 - 07.09 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
18	1	Sorø – Fjenneslev	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 5a	RPM-arbejde Ny sporkasse og ballastrens	4 døgn		05.08 kl. 04.00 - 09.08 kl. 04.00	Sorø spor 3 spærret. Udrangering fra spor 2	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
19	1	Slagelse – Fjenneslev	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 5b	RPM-arbejde Ny sporkasse og ballastrens i Sorø spor 2	1 døgn		05.08 kl. 04.00 - 06.08 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift imellem Slagelse og Fjenneslev. Sorø spor 2 spærret LA80 i Sorø spor 1	Banedanmark	Major
20	1	Slagelse - Sorø	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 6	RPM-arbejde Ny sporkasse og ballastrens	49 døgn		07.09 kl. 04.00 - 26.10 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor min 4000 m	Banedanmark	Major
21	1	Sorø - Slagelse	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 7	RPM-arbejde Ny sporkasse og ballastrens	24 døgn		26.10 kl. 04.00 - 19.11 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor min 4000 m	Banedanmark	Major
22	1	Ringsted	Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted (KURI)	Arbejde over og under broen v. Næstvedvej	180 dage		01.03 – 01.09	Ringsted spor 6 fra spsk. 08b ekskl. til DV-signal 61. Kun aktuel ved politisk valg af løsning 5	Banedanmark	High
23	1/6	Ringsted - Adamshøj	KH1004_01 Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted (KURI) -	Etablering af nyt spor mod øst/flyoversystemet	62 dage		01.06 – 01.08	Ringsted spor 5, samt 1. hovedspor mellem Ringsted og Adamshøj. Kun aktuel ved politisk valg af løsning 5	Banedanmark	High
24	1	(Sprogø) – (Korsør)	Brandvandsrør Storebæltstunnelen	Udskiftning af brandvandsrør i hele storebæltstunnelen	14 døgn		23.04 – 07.05	Spærring af 1. Hovedspor	Sund & Bælt	High
25	1	(Sprogø) – (Korsør)	Brandvandsrør Storebæltstunnelen	Udskiftning af brandvandsrør i hele storebæltstunnelen	14 døgn		21.05 – 04.06	Spærring af 2. Hovedspor	Sund & Bælt	High
26	1	Middelfart - Korsør	Udrulning af signalprogram	Sporskiftarbejde der medfører aflåsninger	42 døgn		16.04 - 28.05	Reducering af trafik om natten op til 50% Reducering af trafik om dagen op til 20% Der vil være stationer hvor der kun kan køres ret igennem	Banedanmark	High
27	1	Middelfart - Korsør	Udrulning af signalprogram	Sporskiftarbejde der medfører aflåsninger	104 døgn		29.05 - 10.09	Reducering af trafik om natten op til 60%	Banedanmark	High

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Reducering af trafik om dagen op til 40% Der vil være stationer hvor der kun kan køres ret igennem		
28	1	Middelfart - Korsør	Udrulning af signalprogram	Sporskiftarbejde der medfører aflåsninger	41 døgn		11.09 - 22.10	Reducering af trafik om natten op til 50% Reducering af trafik om dagen op til 20% Der vil være stationer hvor der kun kan køres ret igennem	Banedanmark	High
29	1	Middelfart - Korsør	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Signalprogrammet	8 døgn 8 timer		15.07 kl. 21.00 - 24.07 kl. 05.00	Totalspærring	Banedanmark	High
30	1	Middelfart - Odense	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Signalprogrammet	5 døgn 8 timer		24.05 kl. 21.00 - 30.05 kl. 05.00	Totalspærring	Banedanmark	High
31	1	(Holmstrup)- (Odense)	Ny Bane Vestfyn	Sporarbejde	1 døgn		03.03 kl. 22.00 - 04.03 kl. 22.00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
32	1	(Holmstrup)- (Odense)	Ny Bane Vestfyn	Sporarbejde	2 døgn		04.03 kl. 22.00 - 06.03 kl. 22.00	Enkeltspødrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Medium
33	1	(Odense)- (Holmstrup)	Ny Bane Vestfyn	Sporarbejde	1 døgn		10.03 kl. 22.00 - 11.03 kl. 22.00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
34	1	(Odense)- (Holmstrup)	Ny Bane Vestfyn	Sporarbejde	2 døgn		11.03 kl. 22.00 - 13.03 kl. 22.00	Enkeltspødrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Medium
35	1	(Odense) - (Middelfart)	Ny Bane Vestfyn	Sporskifte- og kørestrømsarbejder	8 døgn 8 timer		09.04 kl. 21.00 - 18.04 kl. 05.00	Totalspærring Ingen tog mellem Odense og Middelfart	Vejdirektoratet & Banedanmark	High
36	1	(Ejby) - (Middelfart)	NPPO0007/ H1199_01	Etablering af elevator og bro Kauslunde st.	5 døgn og 8 timer		12.04 kl. 21:00 - 18.04 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
37	1	(Ejby) - (Middelfart)	NPPO0007/ H1199_01	Etablering af elevator og bro Kauslunde st.	8 døgn og 8 timer		15.07 kl. 21.00 - 24.07 kl. 05.00	Totalspærring	Banedanmark	High
38	10	København- Østerport	Afvandingsarbejder	Afvandingsarbejder	3 døgn		04.02 - 07.02	Totalspærring København-Østerport	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
39	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejde	14 døgn		14.03 – 28.03	Spærring af 1. Hovedspor Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	High
40	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejde	16 døgn		01.04 – 16.04	Totalspærring Godstrafik via København H Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	High
41	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Spor- og Kørestrømsarbejde	4 døgn		24.05 – 28.05	Totalspærring Godstrafik via København H Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	Medium
42	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Spor- og Kørestrømsarbejde	14 døgn		15.06 – 30.06	Spærring af 1. Hovedspor Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	High
43	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Kørestrømsarbejde	4 døgn		15.07 – 19.07	Totalspærring Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	High
44	21	Odense - (Fruens Bøge)	Ibrugtagning signalprogram	Signalprogrammet ibrugtages på Odense station	8 døgn og 8 timer		15.07 kl. 21.00 - 24.07 kl. 05.00	Totalspærring	Banedanmark	High
45	25	(Aalborg) – Hjørring	NFSP0592	Sporfornylse + 3. Limfjordsforbindelse	68 døgn		10.07 – 16.09	Totalspærring fra mærke Ab-062/064 til mærke Hj-701	Banedanmark	Major
46	25	(Aalborg) – Frederikshavn	NFSP0592	Sporfornylse + 3. Limfjordsforbindelse	16 døgn		16.09 – 02.10	Totalspærring fra mærke Ab-062/064 til mærke Fh-051, Fh-049 samt Fh-047. Samt fra mærke Hj-026 til mærke Hj-031/033	Banedanmark	Major
47	25	Hjørring – Frederikshavn	NFSP0592	Sporfornylse	70 døgn		02.10 – 10.12	Totalspærring fra mærke Hj-002 til mærke Fh-051, Fh-049 samt Fh-047	Banedanmark	Major
48	26	Taulov	NFBR0456	Perronombygning og bro spor 1	37 døgn		08.04 - 14.05	Tog benytter andre spor	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
49	26	Taulov	NFBR0456	Logistikplads AM_4a	70 døgn		15.05 - 23.07	90 meter spærret Koordineres med Taulov kombiterminal	Banedanmark	Major
50	26	(Kolding) - (Fredericia)	NFBR0456	Perronombygning og bro Spor 3	35 døgn		14.05 - 18.06	Der kan ikke udveksles passagerer i nordgående retning	Banedanmark	Major
51	26	Taulov - (Kolding)	NFBR0456	Perronombygning (spunsning) Spor 2	5 dage		22.05 kl. 06:00 - 26.05 kl. 19:00	Dagsspærringer med Enkeltspordrift	Banedanmark	Major
52	26	Taulov - (Kolding)	NFBR0456	Perronombygning (spunsning) Spor 2	1 dage		29.05 kl. 06:00 - 29.05 kl. 19:00	Dagsspærringer med Enkeltspordrift	Banedanmark	Major
53	26	(Kolding) - (Fredericia)	NFBR0456	Perronombygning og bro Spor 2	28 døgn		18.06 - 16.07	Godstog mod Kolding benytter 2. hovedspor. Der kan ikke udveksles passagerer i nordgående retning	Banedanmark	Major
54	26	Taulov - (Kolding)	NFBR0456	Perronombygning (fjernelse af spuns) Spor 3	2 dage		29.06 kl. 06:00 - 30.06 kl. 19:00	Dagsspærringer med enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
55	26	Taulov - (Kolding)	NFBR0456	Perronombygning (fjernelse af spuns) Spor 3	3 dage		03.07 kl. 06:00 - 05.07 kl. 19:00	Dagsspærringer med enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
56	26	(Kolding) - (Snoghøj/Fredericia)	NFBR0456	Broarbejde	7 døgn		16.07 - 23.07	Totalspærring Ingen tog mellem Fredericia/Snoghøj og Kolding	Banedanmark	Major
57	26	Taulov	NFBR0456	Perronombygning Spor 1	7 døgn		23.07 - 30.07	Tog benytter andre spor	Banedanmark	Major
58	26	(Taulov) - (Kolding)	Neutralsektion Eltang	Udskiftning af neutralsektion, gravning, fundering, rejsning af master, trækning af køretråd.	12 timer		09.06 kl. 19:00 - 10.06 kl. 07:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
59	30	(Skærbæk) – (Ribe)	Bro 23444 Rejsby Å	Brorenovering	23 døgn		15.07 – 06.08	Totalspærring	Banedanmark	Major
60	31	(Tarm) - (Ølgod)	Skjern Å bro 23791 NFBR0479	Brorenovering NFBR0479	122 døgn		01.04 - 31.07	Totalspærring	Banedanmark	Major
61	32	Bjerringbro st.	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro st.	Broarbejder og perronarbejder	23 døgn		03.04 - 26.04	Spærring af spor 1 mellem mærke Bj009 og mærke Bj010	Banedanmark	High
62	32	Bjerringbro st.	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Broarbejder og perronarbejder	45 døgn		26.04 - 10.06	Spærring af spor 2 mellem mærke Bj011 og mærke Bj012	Banedanmark	High
63	32	Bjerringbro st.	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Broarbejder	8 døgn		10.06 - 18.06	Totalspærring på Bjerringbro St	Banedanmark	High
64	32	Bjerringbro st.	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Perronarbejder	28 døgn		18.06 - 16.07	Spærring af spor 2 mellem mærke Bj011 og mærke Bj012	Banedanmark	High
65	32	Bjerringbro st.	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Perronarbejder	29 døgn		16.07 - 14.08	Spærring af spor 1 mellem mærke Bj009 og mærke Bj010	Banedanmark	High
66	34	(Struer) - Thisted	Struer-Thisted NFSP0525	Sporombygning, ballastrensning, ny sporkasse og omisolering af broer	121 døgn		20.03 - 19.07	Totalspærring	Banedanmark	Major
67	52	Lindholm – Aalborg Lufthavn	NFSP0592	Sporfornyelse + 3. Limfjordsforbindelse	84 døgn		10.07 – 02.10	Totalspærring i forbindelse med Aalborg - Hjørring	Banedanmark	Major
