



Banedanmarks Netredegørelse 2028 – Bilag 3.5A

Bilag 3.5A

Indhold

Side

1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen

3 - 4

TIB 1 – 35


5 - 20

Fjernbanen

Netredegørelse 2028 - overblik 2028



Fjernbanen - udvalgte delstrækninger Netredefølse 2028 - overblik 2028

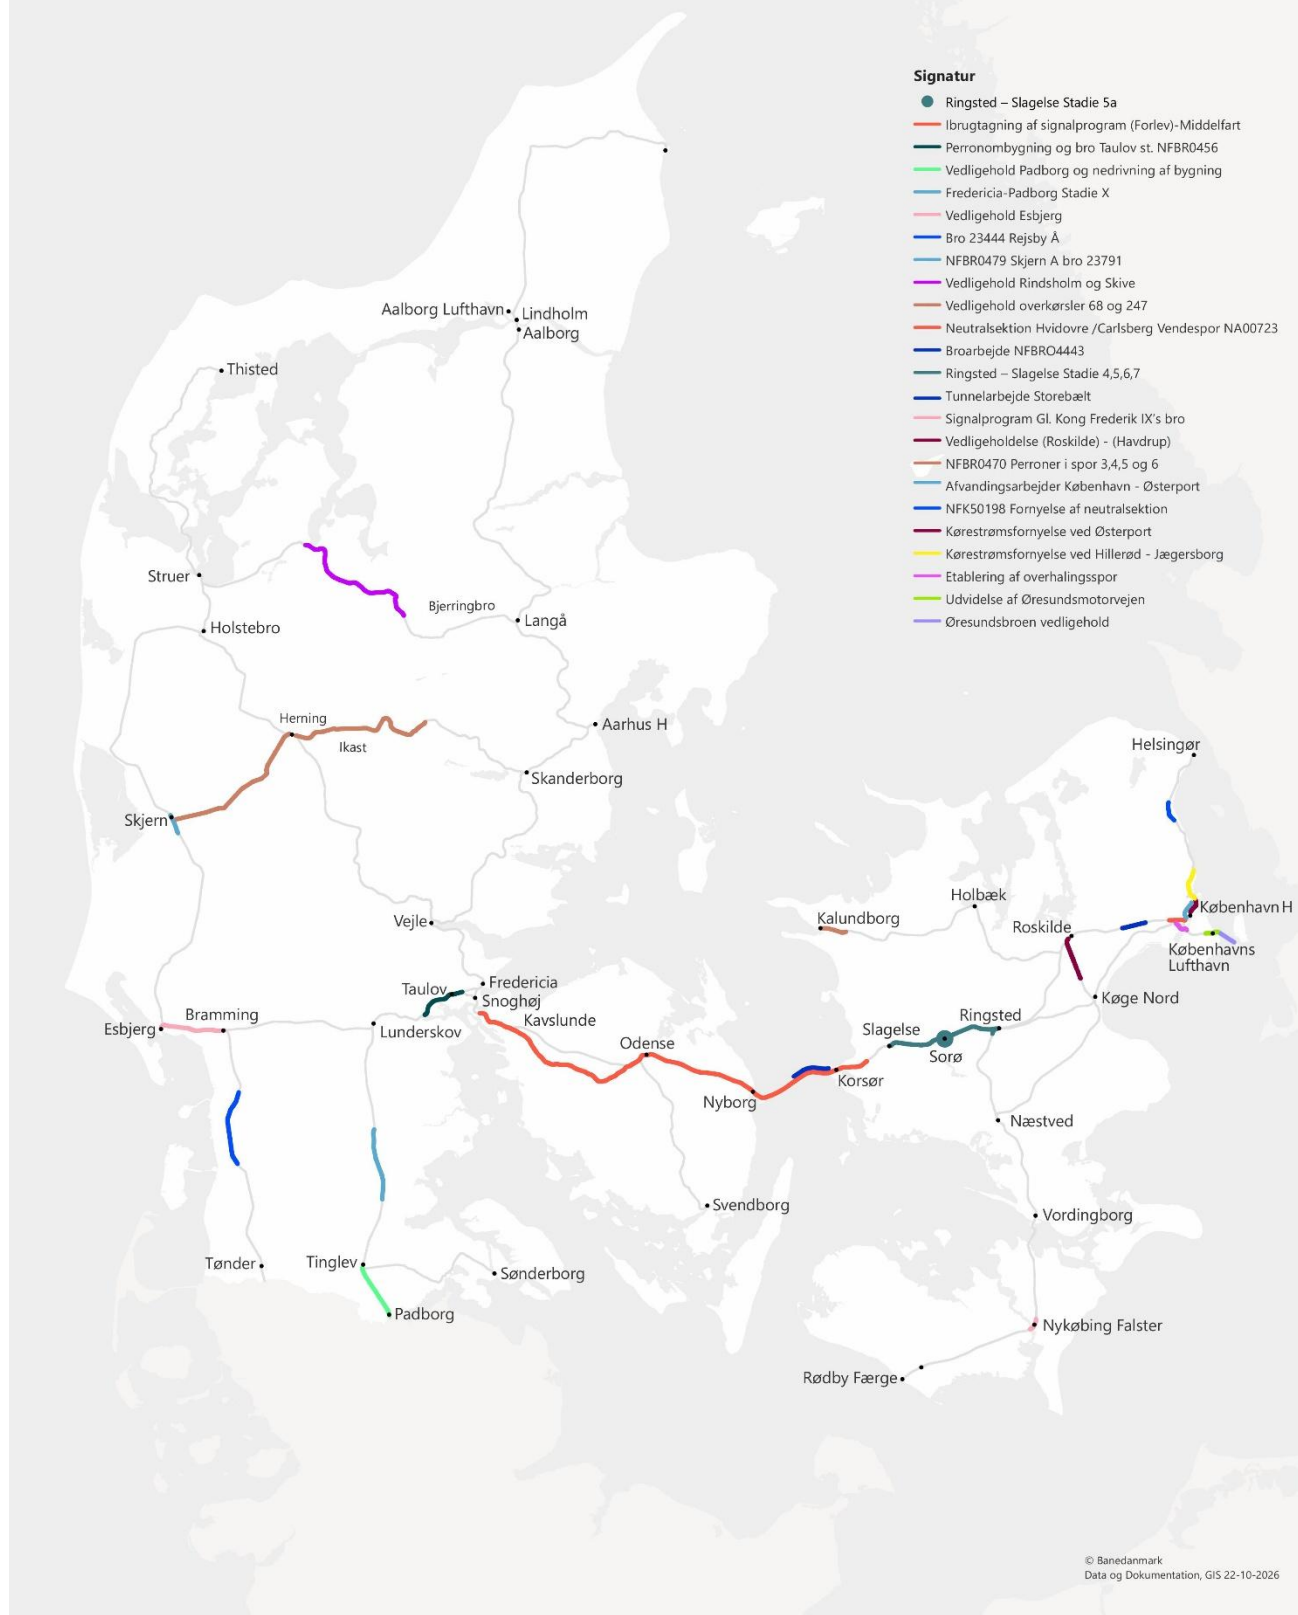

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		03.03 kl. 22:00 - 06.03 kl. 04:00	Spærring af spor 1 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
2	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		10.03 kl. 22:00 - 13.03 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Spor 9 koordineres med S-banen Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
3	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		17.03 kl. 22:00 - 20.03 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
4	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		14.01 kl. 22:00 - 17.01 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
5	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		31.03 kl. 22:00 - 03.04 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Spor 9 koordineres med S-banen Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
6	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		21.04 kl. 22:00 - 24.04 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
7	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		28.04 kl. 22:00 - 01.05 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
8	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		05.05 kl. 22:00 - 08.05 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
9	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		12.05 kl. 22:00 - 15.05 kl. 04:00	Spærring af spor 1 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
10	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		19.05 kl. 22:00 - 22.05 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
11	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		26.05 kl. 22:00 - 29.05 kl. 04:00	Spærring af spor 1 og 2 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
12	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		09.06 kl. 22:00 - 12.06 kl. 04:00	Spærring af spor 3 og 4 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
13	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		11.02 kl. 22:00 - 14.02 kl. 04:00	Spærring af spor 5 og 6 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
14	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		18.02 kl. 22:00 - 21.02 kl. 04:00	Spærring af spor 7 og 8 Logistikkørsel til/fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
15	1	(København H) – (Hvidovre fjern)	Neutralsektion Hvidovre	Udskiftning af neutralsektion	4 døgn og 6 timer		10.09 kl. 22:00 – 15.09 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift København H – Hvidovre fjern	Banedanmark	Medium
16	1	(København H) – (Hvidovre Fjern)	Neutralsektion Hvidovre	Udskiftning af neutralsektion	1 døgn og 10 timer		16.09 kl. 18:00 – 18.09 kl. 04:00	Totalspærring København H – Hvidovre Fjern	Banedanmark	Medium
17	1	(Hvidovre fjern) – (København H)	Neutralsektion Hvidovre	Udskiftning af neutralsektion	4 døgn og 6 timer		20.09 kl. 22:00 – 25.09 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift København H – Hvidovre fjern	Banedanmark	Medium
18	1	(København) – (Hvidovre Fjern)	NA00723 / Carlsberg Vendespor	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen, samt logistikkanal	7 døgn og 6 timer		18.06 kl. 22:30 – 26.06 kl. 04:30	Højre spor København H - Hvidovre Fjern spærret. Hver aften/nat via København H til Godsbanegården	Banedanmark	Medium
19	1	(København) – (Hvidovre Fjern)	NA00723 / Carlsberg Vendespor	Dækningsspærring til arbejdet på S-banen, samt logistikkanal	11 døgn og 22 timer og 30 minutter		03.07 kl. 22:30 – 15.07 kl. 21:00	Højre spor København H - Hvidovre Fjern spærret. Hver aften/nat via København H til Godsbanegården	Banedanmark	High
20	1	(København) – (Hvidovre Fjern)	NA00723 / Carlsberg Vendespor	Underføring under spor 1	12 timer		14.07 kl. 20:00 – 15.07 kl. 08:00	Højre spor Hvidovre Fjern - København H spærret.	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Med døgnspærring København H – Hvidovre Fjern giver dette totalspærring i 12 timer ml. København H og Hvidovre Fjern. Via København H til Godsbanegården		
21	1	(Glostrup) – (Høje Tåstrup)	Broarbejde NFBRO4443	Betonreparationer af sporfletningsbroen i Glostrup (undersiden)	8 døgn og 6 timer		05.03 kl. 22.30 - 14.03 kl. 04.30	Enkeltsporsdrift Glostrup - Høje Tåstrup og LA40 omkring arbejdsstedet	Banedanmark	Major
22	1	(Høje Tåstrup) – (Glostrup)	Broarbejde NFBRO4443	Betonreparationer af sporfletningsbroen i Glostrup (undersiden)	8 døgn og 6 timer		14.03 kl. 22.30 - 23.03 kl. 04.30	Enkeltsporsdrift Glostrup - Høje Tåstrup og LA40 omkring arbejdsstedet	Banedanmark	Major
23	1	Ringsted – Fjenneslev – Sorø	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 4	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning DSM-kørsel, justering K-ophæng	21 døgn og 6 timer		09.07 kl. 22:00 - 31.07 kl. 04:00	Dobbelt venstrespordrift mellem Ringsted - Sorø LA80 i Fjenneslev spor 1	Banedanmark	Major
24*	1	(Sorø) – Fjenneslev	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 5	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning DSM-kørsel, justering K-ophæng	38 døgn		31.07 kl. 04:00 - 07.09 kl. 04:00 Der forventes en ændret spæringsperiode i 2028 jf. kommende artikel 14 høring	Enkeltsporsdrift Sorø - Fjenneslev LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
25*	1	Sorø	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 5a	RPM-arbejde Ny sporkasse og ballastrens	4 døgn		05.08 kl. 04:00 - 09.08 kl. 04:00 Der forventes en ændret spæringsperiode i 2028 jf. kommende artikel 14 høring	Sorø spor 3 spærret. Udrangering fra spor 2 i Sorø	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
26*	1	Slagelse – Fjenneslev	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 5b	RPM-arbejde Ny sporkasse og ballastrens i Sorø spor 2	1 døgn og 6 timer		04.08 kl. 22:00 - 06.08 kl. 04:00 Der forventes en ændret spæringsperiode i 2028 jf. kommende artikel 14 høring	Enkeltsporsdrift imellem Slagelse og Fjenneslev. Sorø spor 2 spærret Ind- og udrangering i Sorø spor 1 LA80 i Sorø spor 1	Banedanmark	Major
27*	1	Slagelse – (Sorø)	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 6	RPM-arbejde Ny sporkasse og ballastrens	49 døgn		07.09 kl. 04:00 - 26.10 kl. 04:00 Der forventes en ændret spæringsperiode i 2028 jf. kommende artikel 14 høring	Enkeltsporsdrift Slagelse - Sorø LA80 i nabospor min 4000 m	Banedanmark	Major
28*	1	Sorø - Slagelse	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 7	RPM-arbejde Ny sporkasse og ballastrens Ny skinner 1200 meter	24 døgn		26.10 kl. 04:00 - 19.11 kl. 04:00 Der forventes en ændret spæringsperiode i 2028 jf. kommende artikel 14 høring	Enkeltsporsdrift Sorø - Slagelse LA80 i nabospor min 4000 m	Banedanmark	Major
29	1	(Sprogø) – (Korsør)	Udskiftning af brandvandsrør i hele tunnelen	Tunnelarbejde	14 døgn og 5 timer		19.03 kl. 22:00 - 03.04 kl. 04:00	Spærring af 1.Hsp Sprogø - Korsør	Sund og Bælt	High
30	1	(Sprogø) – (Korsør)	Udskiftning af brandvandsrør i hele tunnelen	Tunnelarbejde	14 døgn og 6 timer		16.04 kl. 22:00 - 01.05 kl. 04:00	Spærring af 2.Hsp Korsør - Sprogø	Sund og Bælt	High
31	1	(Odense) – Forlev	Signalprogram	Udskiftning af sporskiftedrev	5 døgn og 8 timer		24.05 kl. 21:00 - 30.05 kl. 05:00	Totalspærring Odense - Forlev	Banedanmark	High
32	1	(Snoghøj) - (Slagelse)	Udrulning af signalprogram	Sporskiftearbejde der medfører aflåsninger	103 døgn og 19 timer		30.05 kl. 05:00 - 10.09 kl. 24:00	Reducering af trafik om natten op til 60%	Banedanmark	High

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Reducering af trafik om dagen op til 40% Der vil være stationer hvor der kun kan køres ret igennem		
33	1	(Snoghøj) - (Slagelse)	Signalprogram	Ibrugtagning af Signalprogrammet	8 døgn og 8 timer		15.07 kl. 21:00 - 24.07 kl. 05:00	Totalspærring Middelfart - Forlev	Banedanmark	High
34	1	(Snoghøj) - (Slagelse)	Udrulning af signalprogram	Sporskiftearbejde der medfører aflåsninger	42 døgn		11.09 kl. 00:00 - 22.10 kl. 24:00	Reducering af trafik om natten op til 50% Reducering af trafik om dagen op til 20% Der vil være stationer hvor der kun kan køres ret igennem	Banedanmark	High
35	1	(Holmstrup)- (Odense)	Ny Bane Vestfyn	Sporarbejde	1 døgn		04.03 kl. 22:00 - 05.03 kl. 22:00	Totalspærring Holmstrup - Odense	Banedanmark	Medium
36	1	(Holmstrup)- (Odense)	Ny Bane Vestfyn	Sporarbejde	2 døgn		05.03 kl. 22:00 - 07.03 kl. 22:00	Enkeltpordrift Holmstrup - Odense LA80 i nabospor	Banedanmark	Medium
37	1	(Odense)- (Holmstrup)	Ny Bane Vestfyn	Sporarbejde	1 døgn		11.03 kl. 22:00 - 12.03 kl. 22:00	Totalspærring Odense - Holmstrup	Banedanmark	Medium
38	1	(Odense)- (Holmstrup)	Ny Bane Vestfyn	Sporarbejde	2 døgn		12.03 kl. 22:00 - 14.03 kl. 22:00	Enkeltpordrift Odense - Holmstrup LA80 i nabospor	Banedanmark	Medium
39	1	(Odense) - (Middelfart)	Ny Bane Vestfyn	Sporskifte- og kørestrømsarbejder	5 døgn og 8 timer		12.04 kl. 21:00 - 18.04 kl. 05:00	Totalspærring Odense - Middelfart	Vejdirektoratet & Banedanmark	High
40	1	(Middelfart)- Fredericia/Taulov	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Middelfart - Fredericia - Taulov	Banedanmark	Medium
41	1	(Middelfart)- Fredericia/Taulov	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Middelfart - Fredericia - Taulov	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
42	2	Nykøbing Falster - Nykøbing Falster Vest	Signalprogram	Trafikal ibrugtagning af Signalprogram på Gl. Kong Frederik IX's bro	7 døgn og 8 timer		01.12 kl. 20:00 - 09.12 kl. 04:00	Totalspærring Nykøbing Falster - Nykøbing Falster Vest	Banedanmark	Medium
43	4	(Roskilde) - (Havdrup)	Vedligehold	Udveksling af skinner, befæstelser. Ballast og sveller i Gadstrup spor 1+2 og asfaltering mellem spor 1 & 2	4 døgn og 6 timer		24.05 kl. 23:00 - 29.05 kl. 05:00	Totalspærring Roskilde - Havdrup	Banedanmark	Medium
44	5	(Roskilde) - Kalundborg	Signalprogram	Ibrugtagning af Signalprogram	16 døgn og 8 timer		09.10 kl. 20:00 - 26.10 kl. 04:00	Totalspærring Roskilde - Kalundborg	Banedanmark	Major
45	5	Kalundborg - (Vørslev)	NFBR0470	Perroner samt sporarbejde i spor 3, 4, 5 og 6	46 døgn og 3 timer		04.08 kl. 22:00 - 20.09 kl. 01:00	Kun drift i spor 1 gennem spor 106. Ingen adgang til depot/forsyning for DSB og Contec Rail	Banedanmark	High
46	5	Kalundborg - (Vørslev)	NFBR0470	Perroner i spor 1 og 2 samt sporarbejde i spor 1/12	19 døgn og 19 timer		20.09 kl. 01:00 - 09.10 kl. 20:00	Totalspærring Kalundborg - Vørslev	Banedanmark	Major
47	5	Kalundborg - (Vørslev)	NFBR0470	Perroner samt sporkasse i spor 3, 4, 5 og 6	27 døgn og 17 timer		26.10 kl. 04:00 - 22.11 kl. 20:00	Spor 3, 4, 5 og 6 spærret, drift i spor 1 og 2 samt adgang til depot/forsyning	Banedanmark	Medium
48	10	København - Østerport	Afvandingsarbejder	Afvandingsarbejder	2 døgn og 4 timer og 40 minutter	2. kvartal	04.02 kl. 23:40 - 07.02 kl. 04:20	Totalspærring København H-Østerport. Der vil være mulighed for at åbne 2.hsp for DSB ca. hver 6 time for placering af materiel	Banedanmark	Medium
49	10	(Rungsted) - (Nivå)	NFKS0198	Fornylse af neutralsektion	14 timer		08.07 kl. 18:00 - 09.07 kl. 08:00	Totalspærring Rungsted - Nivå Arbejdsplads er beliggende på Nivå station	Banedanmark	Medium
50	10	(Rungsted) - (Nivå)	NFKS0198	Fornylse af neutralsektion	2 døgn og 6 timer		28.07 kl. 22:00 - 31.07 kl. 04:00	Døgnspærring af højre spor Rungsted - Nivå	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Arbejdsplads er beliggende på Nivå station		
51	10	(Nivå) – (Rungsted)	NFKS0198	Fornyelse af neutralsektion	2 døgn og 6 timer		04.08 kl. 22:00 – 07.08 kl. 04:00	Døgnspærring af højre spor Nivå - Rungsted Arbejdsplads er beliggende på Nivå station	Banedanmark	Medium
52	10	(Helgoland) – Østerport – (København H)	Kørestrømsform yelse ved Østerport	Kørestrømsarbejde	5 døgn og 7 timer		12.04 kl. 21:30 – 18.04 kl. 04:30	Spærring af Østerport spor 4 Enkeltsporsdrift Hellerup - Helgoland – Østerport - København	Banedanmark	Medium
53	10	(Helgoland) – Østerport – (København H)	Kørestrømsform yelse ved Østerport	Kørestrømsarbejde	4 døgn og 7 timer		24.05 kl. 21:30 – 29.05 kl. 04:30	Spærring af Østerport spor 4 Enkeltsporsdrift Hellerup - Helgoland – Østerport - København	Banedanmark	Medium
54	10	(Helgoland) – Østerport – (København H)	Kørestrømsform yelse ved Østerport	Kørestrømsarbejde	2 døgn og 7 timer		09.06 kl. 21:30 – 12.06 kl. 04:30	Spærring af Østerport spor 4 Enkeltsporsdrift Hellerup – Helgoland – Østerport – København H	Banedanmark	Medium
55	10	Helgoland – (Klampenborg)	Kørestrømsform yelse Hillerød – Jægersborg (S-bane)	Dækning for arbejde på S-banen	2 døgn og 7 timer		22.09 kl. 21:30 – 25.09 kl. 04:30	Enkeltsporsdrift Klampenborg – Helgoland Der kan afvikles trafik i begge hovedspor mellem Helgoland - Østerport	Banedanmark	Medium
56	10	Helgoland – (Klampenborg)	Kørestrømsform yelse Hillerød – Jægersborg (S-bane)	Dækning for arbejde på S-banen	2 døgn og 7 timer		13.10 kl. 21:30 – 16.10 kl. 04:30	Enkeltsporsdrift Klampenborg – Helgoland Der kan afvikles trafik i begge hovedspor mellem Helgoland - Østerport	Banedanmark	Medium
57	10	Helgoland – (Klampenborg)	Kørestrømsform yelse Hillerød – Jægersborg (S-bane)	Dækning for arbejde på S-banen	2 døgn og 7 timer		24.11 kl. 21:30 – 27.11 kl. 04:30	Enkeltsporsdrift Klampenborg – Helgoland	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Der kan afvikles trafik i begge hovedspor mellem Helgoland - Østerport		
58	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Spor- og broarbejde	4 døgn		11.03 kl. 05:00 – 15.03 kl. 05:00	Totalspærring Vigerslev – Kalvebod. Godstrafik via København H Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	Medium
59	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Spor- og Kørestrømsarbejde	5 døgn og 8 timer		12.04 kl. 21:00 – 18.04 kl. 05:00	Totalspærring Vigerslev – Kalvebod. Godstrafik via København H Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	Medium
60	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Spor- og Kørestrømsarbejde	6 døgn		01.05 kl. 05:00 – 07.05 kl. 05:00	Spærring af 1. Hovedspor Vigerslev – Kalvebod	Sund & Bælt	Medium
61	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Spor- og Kørestrømsarbejde	11 døgn og 5 timer		24.05 kl. 21:00 – 05.06 kl. 02:00	Spærring af 1. Hovedspor Vigerslev – Kalvebod. Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	High
62	11	Kalvebod – Vigerslev	Etablering af overhalingsspor	Spor- og Kørestrømsarbejde	5 døgn og 8 timer		24.05 kl. 21:00 – 30.05 kl. 05:00	Spærring af 2. Hovedspor Kalvebod – Vigerslev	Sund & Bælt	High
63	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Kørestrømsarbejde	8 døgn og 8 timer		15.07 kl. 21:00 – 24.07 kl. 05:00	Totalspærring Vigerslev – Kalvebod. Godstrafik via København H Logistikkørsel dagligt til og fra det spærrede spor	Sund & Bælt	High
64	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Kørestrømsarbejde	18 døgn og 15 timer		09.08 kl. 04:00 – 27.08 kl. 19:00	Spærring af 1. Hovedspor Vigerslev – Kalvebod.	Sund & Bælt	High
65	11	Kastrup lufthavn	Udvidelse af Øresundsmotor vejen	Ledningsomlægning	7 døgn		24.04 kl. 05:00 – 01.05 kl. 05:00	Spærring af spor 11 og 12 Logistikkørsel til/fra spor 30 dagligt	Sund & bælt	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
66	11	Kastrup lufthavn	Udvidelse af Øresundsmotor vejen	Afskærmning ifm. stibro	7 døgn		15.07 kl. 21:00 – 21.07 kl. 21:00	Spærring af spor 11 og 12 Logistikkørsel til/fra spor 30 dagligt	Sund & bælt	Medium
67	11	(Kastrup Lufthavn) – (Peberholm)	Øresundsbroen vedligehold	Vedligehold af infrastruktur	2 døgn		11.03 kl. 05:00 – 13.03 kl. 05:00	Totalspærring Kastrup Lufthavn – Peberholm Modtaget og varslet af anden infrastrukturforvalter	Øresundsbroen	Medium
68	11	(Kastrup Lufthavn) – (Peberholm)	Øresundsbroen vedligehold	Vedligehold af infrastruktur	4 døgn		13.04 – 17.04	Totalspærring Kastrup Lufthavn - Peberholm. Modtaget og varslet af anden infrastrukturforvalter	Øresundsbroen	Medium
69	11	(Kastrup Lufthavn) – (Peberholm)	Øresundsbroen vedligehold	Vedligehold af infrastruktur	1 døgn		28.10 kl. 05:00 – 29.10 kl. 05:00	Totalspærring Kastrup Lufthavn - Peberholm. Modtaget og varslet af anden infrastrukturforvalter	Øresundsbroen	Medium
70	11	(Kastrup lufthavn) – (Peberholm)	Øresundsbroen vedligehold	Vedligehold af infrastruktur	14 døgn	Forår		Enkeltspørsdrift Kastrup – Peberholm Modtaget og varslet af anden infrastrukturforvalter	Øresundsbroen	High
71	11	(Kastrup Lufthavn) – (Peberholm)	Øresundsbroen vedligehold	Vedligehold af infrastruktur	14 døgn	Efterår		Enkeltspørsdrift Kastrup – Peberholm Modtaget og varslet af anden infrastrukturforvalter	Øresundsbroen	High
72	21	Odense - (Fruens Bøge)	Ibrugtagning signalprogram	Signalprogrammet ibrugtages på Odense station	8 døgn og 8 timer		15.07 kl. 21:00 - 24.07 kl. 05:00	Totalspærring Odense – Fruens Bøge	Banedanmark	High
73	23	Fredericia – Aarhus	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Fredericia - Aarhus	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
74	23	Fredericia - Aarhus	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Fredericia - Aarhus	Banedanmark	Medium
75	24	Aarhus - Aalborg	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Aarhus - Aalborg	Banedanmark	Medium
76	24	Aarhus - Aalborg	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Aarhus - Aalborg	Banedanmark	Medium
77	24	Aalborg	NFSP0592	Parkering af store maskiner til sporombygning, før opstart	7 døgn		01.08 kl. 00:00 – 07.08 kl. 24:00	Spor 21 spærret, parkering af sporombygningsmateriel. Logistikkørsel til Lindholm d. 07.08 1200 m tog	Banedanmark	Medium
78	25	(Aalborg) – Hjørring	NFSP0592	Sporfornyelse og 3. Limfjordsforbindelse	68 døgn		10.07 kl. 00:00 – 15.09 kl. 24:00	Totalspærring Aalborg – Hjørring, fra mærke Ab062/064 til mærke Hj701	Banedanmark	Major
79	25	(Aalborg) – Frederikshavn	NFSP0592	Sporfornyelse og 3. Limfjordsforbindelse	16 døgn		16.09 kl. 00:00 – 01.10 kl. 24:00	Totalspærring Aalborg – Frederikshavn, fra mærke Ab062/064 til mærke Fh051, Fh-049 samt Fh047. Samt fra mærke Hj026 til mærke Hj031/033	Banedanmark	Major
80	25	Hjørring – Frederikshavn	NFSP0592	Sporfornyelse	70 døgn		02.10 kl. 00:00 – 10.12 kl. 24:00	Totalspærring Hjørring - Frederikshavn fra mærke Hj004 til mærke Fh051, Fh049 samt Fh047	Banedanmark	Major
81	25	Aalborg – Frederikshavn	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Aalborg - Frederikshavn	Banedanmark	Medium
82	25	Aalborg – Frederikshavn	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Aalborg - Frederikshavn	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
83	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64 (Vejdirektoratet)	Opførelse af ny bro 64 (Vejdirektoratet)	2 døgn og 8 timer		19.05 kl. 20:00 – 22.05 kl. 04:00	Totalspærret Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
84	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64 (Vejdirektoratet)	Opførelse af ny bro 64 (Vejdirektoratet)	2 døgn og 8 timer		13.10 kl. 20:00 – 16:10 kl. 04:00	Totalspærret Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
85	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64 (Vejdirektoratet)	Opførelse af ny bro 64 (Vejdirektoratet)	2 døgn og 8 timer		20.10 kl. 20:00 – 23.10 kl. 04:00	Totalspærret Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
86	25	(Lindholm) – (Sulsted)	Opførelse af ny bro 64 (Vejdirektoratet)	Opførelse af ny bro 64 (Vejdirektoratet)	2 døgn og 8 timer		27.10 kl. 20:00 – 30.10 kl. 04:00	Totalspærret Lindholm - Sulsted	Vejdirektoratet	Medium
87	26	Taulov	NFBR0456	Perronombygning og bro spor 1	38 døgn		01.04 kl. 23:00 - 09.05 kl. 23:00	Tog benytter andre spor	Banedanmark	Major
88	26	Taulov	NFBR0456	Logistikplads AM_4a	75 døgn og 6 timer		09.05 kl. 23:00 - 24.07 kl. 05:00	90 meter spærret Koordineres med Taulov kombiterminal	Banedanmark	Major
89	26	(Kolding) - (Fredericia)	NFBR0456	Perronombygning og bro Spor 3	35 døgn og 5 timer		09.05 kl. 23:00 - 14.06 kl. 04:00	Der kan ikke udveksles passagerer på Taulov station	Banedanmark	Major
90	26	Taulov - (Kolding)	NFBR0456	Perronombygning (spunsning) Spor 2	5 dage på 13 timer		15.05 kl. 06:00 - 19.05 kl. 19:00	Dagsspærringer med Enkeltspordrift Taulov - Kolding	Banedanmark	Major
91	26	(Kolding) - (Fredericia)	NFBR0456	Udbygning af ledningsadskiller og sporjustering i spor 3	15 timer		12.06 kl. 21:00 - 13.06 kl. 12:00	Kun muligt at afvikle trafik i spor 1 i Taulov, da sporjusteringen også påvirker spor 2. Enkeltspordrift Kolding - Fredericia	Banedanmark	Medium
92	26	(Kolding) - (Fredericia)	NFBR0456	Perronombygning og bro Spor 2	31 døgn og 17 timer		14.06 kl. 04:00 - 15.07 kl. 21:00	Godstog mod Kolding benytter 2. hovedspor. Der kan ikke udveksles passagerer på Taulov station	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
93	26	Taulov - (Kolding)	NFBR0456	Perronombygning (fjernelse af spuns) Spor 3	5 dage på 13 timer		03.07 kl. 06:00 - 07.07 kl. 19:00	Dagsspærringer med enkeltsporsdrift Taulov - Kolding	Banedanmark	Major
94	26	(Kolding) - (Snoghøj/Fredericia)	NFBR0456	Broarbejde	8 døgn 8 timer		15.07 kl. 21:00 - 24.07 kl. 05:00	Totalspærring Kolding – Snoghøj – Fredericia. Ingen tog mellem Fredericia/Snoghøj og Kolding	Banedanmark	Major
95	26	Fredericia - (Taulov)	NFBR0496	Nedrivning af Hannerup brovej	8 døgn 8 timer		15.07 kl. 21:00 - 24.07 kl. 05:00	Totalspærring Fredericia - Taulov	Banedanmark	Major
96	26	Taulov	NFBR0456	Perronombygning	7 døgn		24.07 kl. 05:00 - 31.07 kl. 05:00	Ingen passager udveksling i Taulov	Banedanmark	Major
97	26	Taulov	NFBR0456	Perronombygning	16 døgn		24.07 kl. 05:00 – 09.08 kl. 05:00	Spor 1 spærret	Banedanmark	Major
98	26	(Tinglev) - Padborg	Vedligehold	Vedligehold tilstand	3 døgn og 6 timer		24.05 kl. 23:00 – 28.05 kl. 05:00	Totalspærring Tinglev - Padborg st. inklusiv	Banedanmark	Medium
99	26	(Kolding) – (Taulov)	Neutralsektion Eltang	Fundering af nye master	5 dage på 13 timer		15.05 kl. 06:00 - 19.05 kl. 19:00	Dagsspærringer 2. hovedspor med enkeltsporsdrift Kolding – Taulov. Maskiner skal sporsættes i Kolding	Banedanmark	Medium
100	26	(Taulov) – (Kolding)	Neutralsektion Eltang	Nye master og ledningstræk	8 døgn og 8 timer		15.07 kl. 21:00 - 24.07 kl. 05:00	Totalspærring Taulov – Kolding. Ingen tog mellem Fredericia/Snoghøj og Kolding	Banedanmark	Major
101	26	(Vojens) – (Rødekro)	Fredericia – Padborg	Stadie X	7 døgn		15.07 kl. 21:00 - 22.07 kl. 21:00	Enkeltsporsdrift, 1. hovedspor mellem Vojens og Rødekro spærret	Banedanmark	Medium
102	26	Padborg	DSB-bygninger	Nedrivning af DSB bygning på perron	7 døgn		15.07 kl. 21:00 - 22.07 kl. 21:00	Spærring af spor 1 og 2, 3 og 13, ingen mulighed for passagerudveksling	DSB	Medium
103	26	Fredericia - Padborg	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Fredericia - Padborg	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
104	26	Fredericia - Padborg	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Fredericia - Padborg	Banedanmark	Medium
105	28	Sønderborg - Tinglev	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Sønderborg - Tinglev	Banedanmark	Medium
106	28	Sønderborg - Tinglev	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Sønderborg - Tinglev	Banedanmark	Medium
107	29	Lunderskov - Esbjerg	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Lunderskov - Esbjerg	Banedanmark	Medium
108	29	Lunderskov - Esbjerg	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Lunderskov - Esbjerg	Banedanmark	Medium
109	29	(Bramming) - Esbjerg	Vedligehold	Udveksling af sporskifte 149 til ny sporramme spor 2	2 døgn og 8 timer		08.09 kl. 20:00 – 11.09 kl. 04:00	Totalspærring Esbjerg station	Banedanmark	Medium
110	30	Bramming - Tønder	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Bramming - Tønder	Banedanmark	Medium
111	30	Bramming - Tønder	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Bramming - Tønder	Banedanmark	Medium
112	31	(Tarm) - (Skjern)	Skjern Å bro 23791 H1151_01	Brørenovering NFBR0479	126 døgn og 5 timer		01.05 kl. 00:00 - 04.09 kl. 05:00	Totalspærring med logistikkørsler fra både Tarm og Ølgod	Banedanmark	Major
113	31	(Varde) – (Ølgod)	90076731 90076735	Svelleudveksling sporskifte N101 og N102 i Tistrup	2 døgn og 8 timer		08.09 kl. 20:00 – 11.09 kl. 04:00	Totalspærring Varde – Ølgod, fra mrk. ØGH001 til mrk. TR024, for sporskiftearbejde i Tistrup	Banedanmark	Medium
114	31	Esbjerg – (Guldager)	Vedligehold	Udveksling af sporskifte 149 til ny sporramme spor 2	2 døgn og 8 timer		08.09 kl. 20:00 – 11.09 kl. 04:00	Totalspærring Esbjerg station	Banedanmark	Medium
115	31	Esbjerg - Struer	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Esbjerg - Struer	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
116	31	Esbjerg - Struer	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Esbjerg - Struer	Banedanmark	Medium
117	32	Bjerringbro	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro st.	Broarbejder og perronarbejder	23 døgn		04.04 kl. 00:00 – 26.04 kl. 24:00	Spærring af spor 1 mellem mærke Bj009 og mærke Bj010	Banedanmark	Major
118	32	Bjerringbro	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Broarbejder og perronarbejder	45 døgn		27.04 kl. 00:00 - 10.06 kl. 24:00	Spærring af spor 2 mellem mærke Bj011 og mærke Bj012	Banedanmark	Major
119	32	(Ulstrup) – (Rødkærsbro)	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Broarbejder	8 døgn		11.06 kl. 00:00 - 18.06 kl. 24:00	Totalspærring på Bjerringbro	Banedanmark	Major
120	32	Bjerringbro	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Perronarbejder	28 døgn		19.06 kl. 00:00 – 16.07 kl. 24:00	Spærring af spor 2 mellem mærke Bj011 og mærke Bj012	Banedanmark	Major
121	32	Bjerringbro	H1195_01 Sikkerhed på Bjerringbro station	Perronarbejder	29 døgn		17.07 kl. 00:00 - 14.08 kl. 24:00	Spærring af spor 1 mellem mærke Bj009 og mærke Bj010	Banedanmark	Major
122	32	(Viborg) – (Rødkærsbro)	10164842	Udveksling ballast km 33,851 -33,931 spor 1 Rindsholm	2 døgn og 8 timer		02.06 kl. 21:00 – 05.06 kl. 05:00	Totalspærring Viborg – Rødkærsbro for ballastarbejde i Rindsholm, fra mrk. RK001 til mrk. VG002	Banedanmark	Medium
123	32	(Højslev) – (Rønbjerg)	10164650	Udveksling af sporskifte 102a i Skive	2 døgn og 8 timer		14.07 kl. 21:00 – 17.07 kl. 05:00	Totalspærring Skive station, fra mrk. SK030 og SK022 til HØ003 for sporskiftearbejde i Skive	Banedanmark	Medium
124	32	Langå - Struer	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Langå - Struer	Banedanmark	Medium
125	32	Langå - Struer	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Langå - Struer	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
126	33	Vejle - Holstebro	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Vejle - Holstebro	Banedanmark	Medium
127	33	Vejle - Holstebro	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Vejle - Holstebro	Banedanmark	Medium
128	34	(Struer) - Thisted	Struer-Thisted NFSP0525	Sporombygning, ballastrensning, ny sporkasse og omisolering af broer	121 døgn		20.03 kl. 04:00 - 19.07 kl. 04:00	Totalspærring Struer - Thisted	Banedanmark	Major
129	34	Struer - Thisted	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Struer - Thisted	Banedanmark	Medium
130	34	Struer - Thisted	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Struer - Thisted	Banedanmark	Medium
131	35	(Silkeborg) - Funder	10131215	Renovering overkørsel 68	1 døgn og 12 timer		24.06 kl. 17:00 - 26.06 kl. 05:00	Totalspærring Silkeborg fra mrk. SL004 - Funder mrk. FU021	Banedanmark	Medium
132	35	Ikast	TIPO	Perronovergang i niveau.	2 døgn og 8 timer		07.07 kl. 20:00 - 10.07 kl. 04:00	Spor 1 spærret, der kan ikke krydses, der kan ikke passagerudveksles i spor 2	Banedanmark	Medium
133	35	(Borris) - (Skjern)	90086143	Renovering overkørsel 247	2 døgn og 8 timer		05.05 kl. 21:00 - 08.05 kl. 05:00	Totalspærring Borris - Skjern, fra mrk. BS029 til mrk. BS022	Banedanmark	Medium
134	35	Skanderborg - Skjern	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Skanderborg - Skjern	Banedanmark	Medium
135	35	Skanderborg - Skjern	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Skanderborg - Skjern	Banedanmark	Medium
136	52	Lindholm - Aalborg Lufthavn	NFSP0592	Sporfornyelse + 3. Limfjordsforbindelse	84 døgn		10.07 kl. 00:00 - 01.10 kl. 24:00	Totalspærring i forbindelse med Aalborg - Hjørring	Banedanmark	Major
137	52	Lindholm - Aalborg Lufthavn	Signalprogram	Software opgradering & andet	15 timer	December		Totalspærring Lindholm - Aalborg Lufthavn	Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
138	52	Lindholm – Aalborg Lufthavn	Signalprogram	Software opgradering & East/West Interface	15 timer	Uge 29		Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Banedanmark	Medium
139	52	Lindholm – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55 og kørestrømsarbejder	Opførelse af ny bro 55 og kørestrømsarbejder	2 døgn og 8 timer		19.05 kl. 20:00 – 22.05 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
140	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55 og kørestrømsarbejder	Opførelse af ny bro 55 og kørestrømsarbejder	2 døgn og 8 timer		23.06 kl. 20:00 – 26.06 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
141	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		30.06 kl. 20:00 – 03.07 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
142	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		27.10 kl. 20:00 – 30.10 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
143	52	(Lindholm) – Aalborg Lufthavn	Opførelse af ny bro 55	Opførelse af ny bro 55	2 døgn og 8 timer		03.11 kl. 20:00 – 06.11 kl. 04:00	Totalspærring Lindholm – Aalborg Lufthavn	Vejdirektoratet	Medium
