



Netredegørelsen 2023 – Bilag 3.5A





Bilag 3.5A

Indhold	Side
1. Fjernbanen	
Oversigt over Fjernbanen	3 - 5
TIB 1 – 35	7 - 15
2. S-banen	
Oversigt over S-banen	6
TIB 810 – 880	16

Fjernbanen TIB 23-35

Netredegørelsen 2023 - overblik 2023


- **Fredericia – Børkop - Vejle**
Ballastrensning
- **Hedensted – Horsens**
Elektrificering – Forberedende arbejder
- **Hadsten**
Broarbejde
- **Lindholm – Frederikshavn**
Signalprogrammet
- **Struer – Esbjerg/Langå/Thisted**
Signalprogrammet
- **Skanderborg – Skjern**
Signalprogrammet



S-banen

Netredegørelsen 2023 - overblik 2023

- Jægersborg – Hillerød
Signalprogrammet
- Ny Ellebjerg – Ryparken
Signalprogrammet
- Hellerup St.
Køreledningsudskiftning
- Gentofte St.
Køreledningsudskiftning
- Gentofte - Sorgenfri
Køreledningsudskiftning
- Vangede - Stengården
Letbanen ved Buddinge
- Køge St.
Broarbejde
- Herlev – Ballerup
Stiforbindelse
- Ny Ellebjerg St.
Metroprojektet

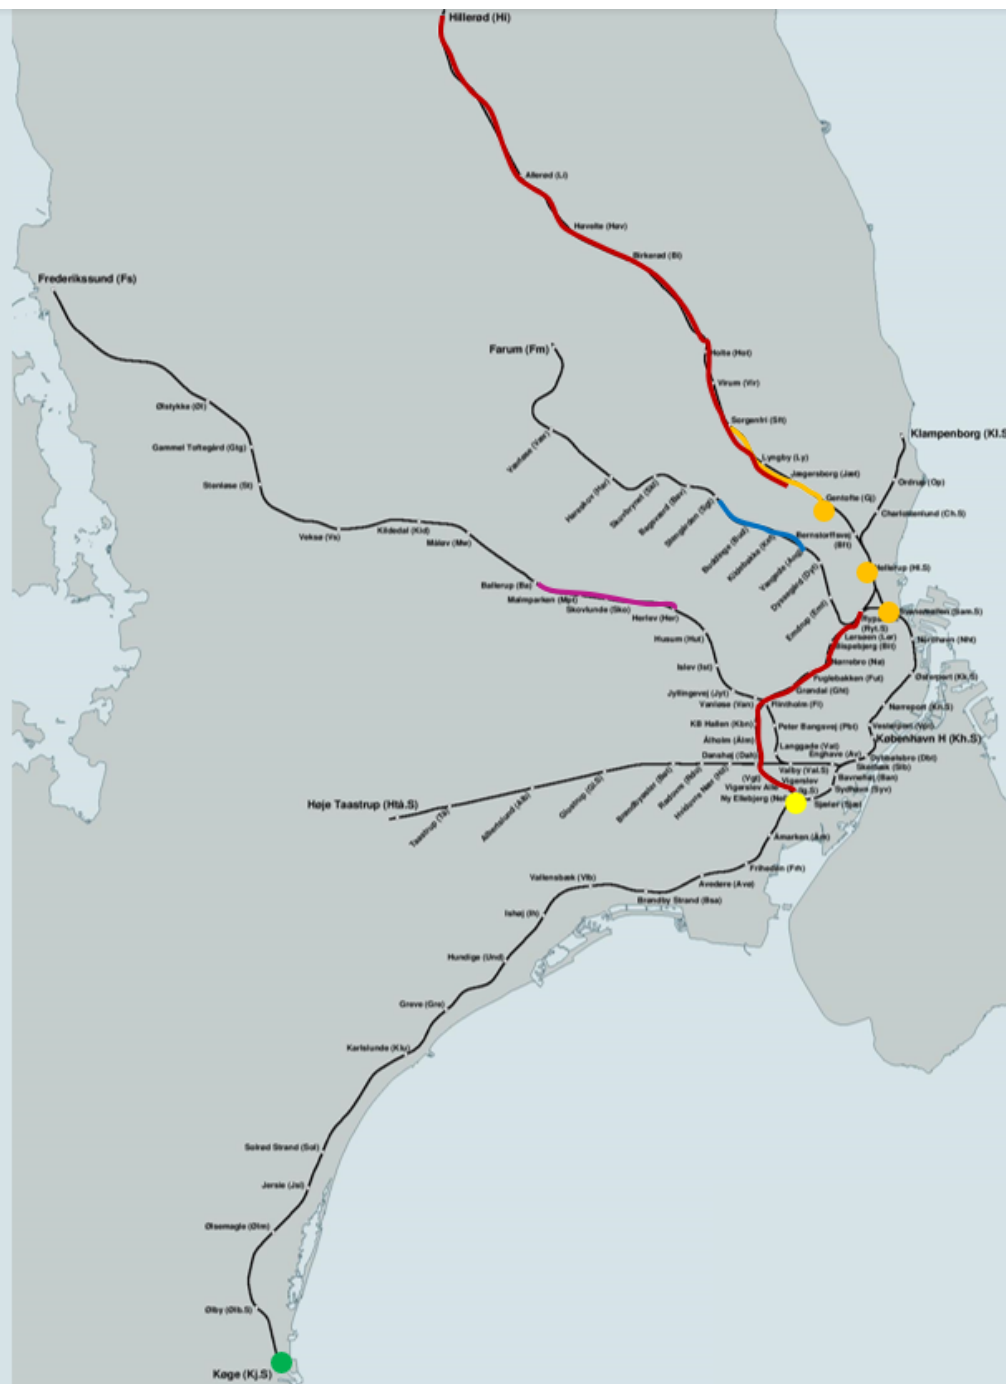

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	1	Kværkeby (ekskl.) – Borup (inkl.)	Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	Sporarbejder ml. Kværkeby-Borup	19 døgn	2. kvartal 2023	17/5-4/6	Højre spor Kværkeby-Borup spærret	Banedanmark	High
2	1	Borup (inkl.) - Kværkeby (inkl.)	Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	Sporarbejder ml. Borup og Kværkeby	21 døgn	2. kvartal 2023	5/6-25/6	Højre spor Kværkeby-Borup spærret	Banedanmark	High
3	1	Borup (inkl.)- Viby Sj (inkl.)	Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	Sporarbejder ml. Viby Sj og Borup	22 døgn	2. og 3. kvartal 2023	26/6-17/7	Højre spor Borup-Viby spærret	Banedanmark	High
4	1	Viby Sj (ekskl.)- Borup (inkl.)	Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	Sporarbejder ml. Viby Sj og Borup	20 døgn	3. kvartal 2023	18/7-6/8	Højre spor Kværkeby-Borup spærret	Banedanmark	High
5	1	Forlev (inkl.) – Korsør (inkl.)	Sporfornyelse Slagelse-Korsør	Spor-afvandings-/jord- og kørestrømsarbejder	11 dage	Forår/sommer	5/5 – 15/5	Enkeltsporsdrift venstresporskørsel	Banedanmark	High
6	1	Korsør (inkl.) – Forlev (inkl.)	Sporfornyelse Slagelse-Korsør	Spor-afvandings-/jord- og kørestrømsarbejder	6 dage	Forår/sommer	16/5 – 21/5	Enkeltsporsdrift venstresporskørsel	Banedanmark	High
7	1	Forlev (inkl.) – Slagelse (inkl.)	Sporfornyelse Slagelse-Korsør	Spor-afvandings-/jord- og kørestrømsarbejder	5 dage	Forår/sommer	22/5 – 26/5	Enkeltsporsdrift venstresporskørsel	Banedanmark	Medium
8	1	Slagelse (inkl.) – Forlev (inkl.)	Sporfornyelse Slagelse-Korsør	Spor-afvandings-/jord- og kørestrømsarbejder	8 dage	Forår/sommer	27/5 – 4/6	Enkeltsporsdrift venstresporskørsel	Banedanmark	High
9	1	Slagelse (inkl.) – Korsør (inkl.)	Sporfornyelse Slagelse-Korsør	Spor-afvandings-/jord- og kørestrømsarbejder Bro arbejder.	8 dage 8 timer	Sommer	23/7 – 30/7	Totalspærring	Banedanmark	High
10	1	Korsør (inkl.) – Sprogø (inkl.)	Renovering af Pumesump	Renovering af pumesump, samt udskiftning af nøddøre.	32 dage	Forår/sommer	31/5 – 2/7	Enkeltsporsdrift	Sund og Bælt	Major
11	1	Korsør	Hastighedsopgradering	Hastighedsopgradering udveksling af sporskifter.	8 dage 8 timer	Sommer	23/7 – 30/7	Totalspærring	Sund og Bælt	High
12	1	Odense (ekskl.) – Nyborg (inkl.) Alle spor	Middelfart – Nyborg Sporfornyelse	Sporfornyelse/opgradering	77 timer	Forår	6/4 – 10/4	Totalspærring	Banedanmark	Medium
13	1	Ullerslev (ekskl.) – Nyborg (ekskl.)	Middelfart – Nyborg Sporfornyelse	Sporfornyelse/opgradering	20 døgn	Forår	10/4 – 30/4	Venstresporskørsel	Banedanmark	High
14	1	Marslev (ekskl.) – Ullerslev (ekskl.) Højre spor	Middelfart – Nyborg Sporfornyelse	Sporfornyelse/opgradering	20 døgn	Forår	30/4 – 20/5	Venstresporskørsel	Banedanmark	High
15	1	Odense (ekskl.) – Nyborg (inkl.) Alle spor	Middelfart – Nyborg Sporfornyelse	Sporfornyelse/opgradering	30 timer	Forår	20/5 – 22/5	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
16	1	Odense (ekskl.) – Marslev (ekskl.) Højre spor	Middelfart – Nyborg Sporformyelse	Sporformyelse/opgradering	20 døgn	Sommer	22/5 – 11/6	Venstresporskørsel	Banedanmark	High
17	1	Marslev (ekskl.) – Odense (ekskl.) Højre spor	Middelfart – Nyborg Sporformyelse	Sporformyelse/opgradering	16 døgn	Sommer	11/6 – 27/6	Venstresporskørsel	Banedanmark	High
18	1	Nyborg (ekskl.) – Ullerslev Højre (ekskl.) spor	Middelfart – Nyborg Sporformyelse	Sporformyelse/opgradering	20 døgn	Sommerferie	27/6 – 17/7	Venstresporskørsel	Banedanmark	High
19	1	Ullerslev (ekskl.) – Marslev (ekskl.) Højre spor	Middelfart – Nyborg Sporformyelse	Sporformyelse/opgradering	5 døgn	Sommerferie	17/7 – 22/7	Venstresporskørsel	Banedanmark	Medium
20	1	Odense (ekskl.) – Nyborg (inkl.) Alle spor	Middelfart – Nyborg Sporformyelse	Sporformyelse/opgradering	8 døgn	Sommerferie	22/7 – 31/7	Totalspærring	Banedanmark	High
21	1	Ullerslev (ekskl.) – Marslev (ekskl.) Højre spor	Middelfart – Nyborg Sporformyelse	Sporformyelse/opgradering	7 døgn	Sommerferie	31/7 – 7/8	Venstresporskørsel	Banedanmark	High
22	1	Tommerup (ekskl.) – Aarup (ekskl.)	Stenkiste	Renovering af stenkiste	6 døgn	Sommer	23/7-28/7	Totalspærring	Banedanmark	Medium
23	1/23/26	Taulov (ekskl.) – Fredericia (inkl.)	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	2 døgn	Sommer	21/7-22/7	Spør 10, spor 18 spærret i Fredericia.	Banedanmark	Medium
24	1/23/26	Fredericia (inkl.) – Taulov (ekskl.)	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	6 døgn + 6 timer	Sommer	23/7-29/7	Venstresporskørsel Fredericia-Taulov. Kørsel kun muligt fra spor 2-5	Banedanmark	Medium
25	1/23/26	Fredericia (inkl.) – Snoghøj (ekskl.)	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	6 døgn + 6 timer	Sommer	23/7-29/7	Totalspærring	Banedanmark	Medium
26	1/23/26	Middelfart (ekskl.) – Fredericia (inkl.)	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	2 døgn	Sommer	29/7-31/7	Venstresporskørsel Middelfart-Snoghøj-Fredericia + Fredericia spor 20 og spor 21	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
27	1/23/26	Fredericia	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	3 døgn	Sommer	31/7-2/8	Nordlige ende af spor 5+6 spærret + spor 47 sydlige ende. Ikke muligt at komme i spor 5 nord eller spor 47. Ingen kørestrøm i spor 47 (nordlig ende kun diesel togsæt)	Banedanmark	Medium
28	1/23/26	Fredericia	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	8 døgn	Sommer	3/8-10/8	Fig. Er spærret sydlig ende af spor 44,45,46 og 47 samt nordlig ende af spor 5 og spor 6 samt spor 105. Ikke muligt at køre i spor 5 nord, kørsel til spor 44, 45, 46, 47 kun fra nord Ingen kørestrøm i spor 47	Banedanmark	High
29	1/23/26	Fredericia	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	3 døgn	Sommer	11/8-13/8	Fig. Er spærret sydlig ende af spor 47 samt nordlig ende af spor 5 og spor 6 samt spor 105. Ikke muligt at køre i spor 5 nord, kørsel til spor 47 kun fra nord Ingen kørestrøm i spor 47.	Banedanmark	Medium
30	1/23/26	Fredericia (inkl.) – Børkop (inkl.)	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	17 døgn	Sommer	14/8-30/8	Spærret nordlig ende af spor 3,4,5,6, sydlig ende af spor 47 samt spor 105 Reduceret drift Venstresporskørsel Fredericia-Børkop Ingen kørsel til spor 5 nord, kørsel til spor 47 kun fra nordenden. Ingen kørestrøm i spor 47	Banedanmark	High
31	1/23/26	Fredericia	Sporombygning Fredericia	Spor og sporskiftarbejder	10 døgn	Sommer	31/8-10/9	Spor 4, 5 og 6 spærret fra perron mod nord. Alle tog mod nord venstre spor Fredericia-Børkop d. 31/8-04/9	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
								Alle tog mod nord via spor 2 og 3 d. 5/9-10/9 Godstog fra øst/syd rangeres væk straks efter ankomst		
32	1/23/26	Fredericia st	Ballastrensning Fredericia – vejle	Nabospor spærres, til logistik mm.	53 døgn	3 kvartal	09/8-30/9	Spor 101, 102, 105, 310, 300, 301 totalspærres	Banedanmark	High
33	1/26	Snoghøj	Sporskifter Snoghøj	Udskiftning af sporskifter og sporkasse	6 døgn + 6 timer	Sommer	23/7-29/7	Totalspærring	Banedanmark	High
34	2	Nykøbing Falster Vest (inkl.) – Rødby Færge (inkl.)	RFB Fase II	Udvidelse til to spor og forbindelse til Femern forbindelsen	365 dage	Hele året og frem til 2029	1/1 – 31/12	Totalspærring, ekskl. Lollandsbanen	Banedanmark	Major
35	2	Nykøbing Falster Vest	RFB Fase II	Etablering af overkørsel øst for Kong Fr. IX's bro	56 timer	Efterår	20/10 – 23/10	Totalspærring inkl. Lollandsbanen	Banedanmark	Medium
36	2	Næstved (ekskl.) – Lundby (ekskl.)	Tilslutningsspor til DSB-værksted Næstved	Spor-afvandings-/jord- og kørestrømsarbejder	55 timer	Forår	31/3 – 3/4	Enkeltsporsdrift Lu – Næ	Banedanmark/DSB	Medium
37	2	Næstved (ekskl.) – Lundby (ekskl.)	Tilslutningsspor til DSB-værksted Næstved	Spor-afvandings-/jord- og kørestrømsarbejder	53 timer	Forår	8/4-10/4	Totalspærring - ingen trafik	Banedanmark/DSB	Medium
38	2	Næstved (ekskl.) – Lundby (ekskl.)	Tilslutningsspor til DSB-værksted Næstved	Spor-afvandings-/jord- og kørestrømsarbejder	21 timer	Forår	10/4-11/4	Enkeltsporsdrift Lu – Næ	Banedanmark/DSB	Medium
39	5	Holbæk (inkl.) – Regstrup (inkl.) Regstrup (inkl.) – Knapstrup (inkl.) Jyderup (inkl.) – Svebølle (inkl.)	NA0040 Forberedelse for elektrificering	Nedrivning Bro 16232 og 16256 + oplæg af stillads bro 16225	Weekend-spærring	Maj/Juni		Totalspærring	Banedanmark	Medium
40	5	Holbæk (inkl.) – Regstrup (inkl.)	NA0040 Forberedelse for elektrificering	Nedrivning af bro 16226	Weekend-spærring	November/december		Totalspærring	Banedanmark	Medium
41	11	Bavnehøj (inkl.) – Kastrup (inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 4	Ibrugtagning og test af sporskifter	8 døgn	Q3	23/7 – 31/7	Totalspærring.	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
								Tog fra Sverige kan komme til perron med lav hastighed.		
42	11	Peberholm – Kastrup (inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 4	Ibrugtagning og test af sporskifter	3 døgn	Q3	7/4 – 10/4	Totalspærring Tog fra Københavns Hovedbanegård kan komme til perron med lav hastighed.	Banedanmark	Medium
43	11	Bavnehøj (inkl.) – Peberholm	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 4	Ibrugtagning og test af sporskifter	3*56 timer	Q1, Q2, Q3	Ukendt	Totalspærring	Banedanmark	Medium
44	11 / 6	Kalvebod (ekskl.) – Vigerslev (inkl.) / København G (inkl.) - Køge Nord (inkl.)	Flytning af sikringshytte	Spor 21,22,23,24	Lang weekend-spærring 55 timer	Efterår 2023	Uge 29	Konsekvenser endnu ikke kendt	Metroselskabet I/S	Medium
45	11	Kalvebod (inkl.) – Vigerslev (inkl.) Sp 21 og 22	Tilslutningsløsning mellem NEL fælles concourse og nye perroner på Øresundsbanen (MS projekt: CRSH7)	Stadie 1: Ledningsomlægning Etablering af kørevej over spor 21 og 22	Lang weekend-spærring 55 timer	Efterår 2023	Uge 36	Totalspærring, Toggang omlægges	Metroselskabet I/S	Medium
46	11	Kalvebod (inkl.) – Vigerslev (inkl.) Sp 21 og 22	Do	Stadie 2: Ledningsomlægning Etablering af ny ankre for bro 12002	Lang weekend-spærring 55 timer	Efterår 2023	Uge 44	Totalspærring, Toggang omlægges	Metroselskabet I/S	Medium
47	11	Kalvebod (inkl.) – Vigerslev (inkl.) Sp 21 og 22	Do	Stadie 4: Indlægning af midlertidig sporafstivning	Totalspærring 3 uger	Vinter 2023-2024	Uge 48 – 51	Totalspærring, Toggang omlægges. Herefter LA40 i begge spor indtil stadie 7 er gennemført i 2024	Metroselskabet I/S	High
48	11	Kalvebod (inkl.) – Vigerslev (inkl.) Sp 21	Do	Stadie X: Etablering af perron	7 uger	Vinter 2023-2024	Uge 45 – 51	Totalspærring, Toggang omlægges. Kan måske udføres delvist sammen med/i forlængelse af 3 ugers totalspærring nævnt ovenfor.	Metroselskabet I/S	Major

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
49	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 1: Køreledningsarbejder, bl.a. Flytning af kobler	2 døgn		17/08 – 19/08	Spærring af spor 11+12, alle tog via spor 1+2 og SORF fra 2.Hsp Peberholm – Kastrup	Sund og Bælt	Medium
50	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 1.1: Afvandingsarbejde og udskiftning af sporskifte	4 døgn		19/08 – 23/08	Spærring af spor 11+12, alle tog via spor 1+2 og SORF fra 2.Hsp Peberholm – Kastrup	Sund og Bælt	Medium
51	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 2.1: Køreledningsportaler	2 døgn		12/09 – 14/09	Spærring af spor 11+12, alle tog via spor 1+2 og SORF fra 2.Hsp Peberholm – Kastrup	Sund og Bælt	Medium
52	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 2.2: Køreledningsarbejder	1 døgn		14/09 – 14/09	Spærring af spor 11, alle tog via spor 1+2+12	Sund og Bælt	Medium
53	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 2.3: Køreledningsarbejder	1 døgn		15/09 – 15/09	Spærring af spor 12, alle tog via spor 1+2+11	Sund og Bælt	Medium
54	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 2.4: Perronforanker	30 døgn		15/09 – 15/10	Spærring af spor 11, alle tog via spor 1+2+12	Sund og Bælt	Major
55	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 2.5: Perronforanker	29 døgn		15/10 – 13/11	Spærring af spor 12, alle tog via spor 1+2+11	Sund og Bælt	Major
56	11	Københavns Lufthavn Kastrup (ekskl.) – Peberholm (inkl.)	Vedligehold	Vedligehold af Øresundsbroen	24 timer	Marts	18/3 – 19/3	Totalspærring	Øresundsbroen	Medium
57	11	Københavns Lufthavn Kastrup (ekskl.) – Peberholm (inkl.)	Vedligehold	Vedligehold af Øresundsbroen	24 timer	April	8/4 – 9/4	Totalspærring	Øresundsbroen	Medium
58	11	Københavns Lufthavn Kastrup (ekskl.) – Peberholm (inkl.)	Vedligehold	Vedligehold af Øresundsbroen	24 timer	November	4/11 – 5/11	Totalspærring	Øresundsbroen	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
59	23	Børkop (inkl.) – Vejle (inkl.)	Ballastrensning Fredericia – vejle	Ballast + sporkasse	1 døgn	3 kvartal	5/9 – 5/9	Reduceret drift Børkop – Vejle, alle tog venstre spor Børkop – Vejle	Banedanmark	Medium
60	23	Fredericia (inkl.) Børkop (inkl.) - Vejle (inkl.)	Ballastrensning Fredericia – vejle	Ballast + sporkasse	6 døgn + 6 timer	3 kvartal	6/9 – 12/9	Totalspærring Børkop-Vejle	Banedanmark	High
61	23	Børkop (inkl.) – Vejle (inkl.)	Ballastrensning Fredericia – vejle	Ballast + sporkasse	15 døgn	3 kvartal	12/9 – 26/9	Reduceret drift Børkop – Vejle, alle tog venstre spor Børkop – Vejle	Banedanmark	High
62	23	Fredericia (inkl.) – Børkop (inkl.)	Ballastrensning Fredericia – vejle	Ballast + sporkasse	6 døgn	3 kvartal	14/8-19/8	Reduceret drift Fredericia - Børkop, alle tog venstre spor Fredericia - Børkop	Banedanmark	Medium
63	23	Fredericia (inkl.) – Børkop (inkl.) – Vejle (inkl.)	Ballastrensning Fredericia – vejle	Ballast + sporkasse	16 timer	3 kvartal	19/8-20/8	Totalspærring Fredericia - Børkop	Banedanmark	Medium
64	23	Fredericia (inkl.) – Børkop (inkl.)	Ballastrensning Fredericia – vejle	Ballast + sporkasse	15 døgn	3 kvartal	20/8-04/9	Reduceret drift Fredericia - Børkop, alle tog venstre spor Fredericia - Børkop	Banedanmark	High
65	23	Børkop (inkl.) – Vejle (ekskl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, nyt sted 20531	1 x weekendspærring	1. kvartal 2023	d. 3/2-6/2	Totalspærring	Banedanmark	Medium
66	23	Vejle station	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20596	1 x weekendspærring	2. kvartal 2023	31/3-3/4	Totalspærring Vejle ekskl. – Hedensted ekskl.	Banedanmark	Medium
67	23	Vejle station	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20596	5 x døgnspærringer	2. kvartal 2023	6/4-11/4	Totalspærring Vejle ekskl. – Hedensted ekskl.	Banedanmark	Medium
68	23	Hedensted (ekskl.) – Horsens (ekskl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	1 x weekendspærring	1. kvartal 2023	31/3-3/4	Totalspærring Hedensted ekskl. – Horsens ekskl.	Banedanmark	Medium
69	23	Hedensted (ekskl.) – Horsens (ekskl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	4 x døgnspærringer	2. kvartal 2023	7/4-11/4	Totalspærring Hedensted ekskl. – Horsens ekskl.	Banedanmark	Medium
70	23	Horsens (ekskl.) – Hedensted (ekskl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	10 x døgnspærringer	2. kvartal 2023	11/4-21/4	Reduceret drift. Højre spor spærret Horsens-Hedensted. Alle tog Horsens – Hedensted venstre spor.	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
71	23	Hedensted (ekskl.) – Horsens (ekskl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	2 x døgnspæringer	2. kvartal 2023	21/4-23/4	Reduceret drift. Højre spor spærret Hedensted - Horsens. Alle tog Hedensted - Horsens venstre spor.	Banedanmark	Medium
72	23	Hedensted (ekskl.) – Horsens (ekskl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	1 x weekendspærring	3. kvartal 2023	23/6-26/6	Totalspærring Hedensted ekskl. – Horsens ekskl.	Banedanmark	Medium
73	24	Hadsten	NA0044 Bro 20950 Skanderborgvej	Broarbejde	2 x 8 timer	sommer	8/7-10/7	Totalspærring Hinnerup-Hadsten-Langå	Banedanmark	Medium
74	24	Hadsten	NA0044 Bro 20950 Skanderborgvej	Broarbejde	3 x 56 timer	Sommer	14/7-17/7 28/7-31/7 4/8-7/8	Totalspærring Hinnerup-Hadsten-Langå		Medium
75	25	Lindholm (ekskl.) – Frederikshavn (inkl.)	Signalprogram	Update of ETRMS	15 timer	3. kvartal	22/9-23/9	Alle spor spærret. Spærringen berører privatbanerne Hjørring – Hirtshals og Frederikshavn – Skagen	Banedanmark	Medium
76	26	Padborg St.	Optimering af spor	Fjernelse af vognvægt	5 døgn	3. kvartal	21/8-25/8	Spor 24 spærret	Banedanmark	Medium
77	31	Esbjerg (ekskl.) – Struer (inkl.)	Signalprogram	Update of ETRMS	15 timer	3. kvartal	22/9-23/9	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
78	32	Langå (ekskl.) – Struer (inkl.)	Signalprogram	Update of ETRMS	15 timer	3. kvartal	22/9-23/9	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
79	33	Vejle (ekskl.) – Holstebro (inkl.)	Signalprogram	Update of ETRMS	15 Timer	3. kvartal	22/9-23/9	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
80	34	Struer (inkl.) – Thisted (inkl.)	Signalprogram	Update of ETRMS	15 Timer	3. kvartal	22/9-23/9	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
81	35	Skanderborg (ekskl.) – Skjern (inkl.)	Signalprogram	Update of ETRMS	15 Timer	3. kvartal	22/9-23/9	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
82	35	Silkeborg (ekskl.) – Funder (ekskl.)	Afvanding NFFO0052	Afvandingsarbejder pga. uroligt spor	7 døgn	sommerferie	31/7-6/8	Totalspærring	Banedanmark	High
83	31	Ringkøbing (ekskl.) –	Signalprogram RO6	Ibrugtagning	1 uge	2.kvartal	2/4 – 9/4 (uge 14)	Alle spor spærret	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
		Holstebro (ekskl.)								
84	35	Herning (ekskl.) – Kibæk (inkl.)	Signalprogram RO6 ibrugtagning	Ibrugtagning	56 timer	2.kvartal	2/4 - 4/4	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
85	31	Herning (ekskl.) – Skjern (ekskl.)	Signalprogram RO6 ibrugtagning	Ibrugtagning	1 uge	2.kvartal	16/4 – 23/4 (uge 16)	Alle spor spærret	Banedanmark	High
86	31	Ulfborg (ekskl.) – Ølgod (ekskl.)	Signalprogram RO6 ibrugtagning	Ibrugtagning	1 uge	2.kvartal	30/4 – 7/5 (uge 18)	Alle spor spærret	Banedanmark	High
87	35	Skjern (inkl.) – Borris (ekskl.)	Signalprogram RO6 ibrugtagning	Ibrugtagning	1 uge	2.kvartal	30/4 – 7/5 (uge 18)	Alle spor spærret	Banedanmark	High
88	31	Skjern (ekskl.) – Esbjerg (ekskl.)	Signalprogram RO6 ibrugtagning	Ibrugtagning	1 uge	2.kvartal	14/5 – 21/5 (uge 20)	Alle spor spærret	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	820 880	Jægersborg (inkl.) – Hillerød (inkl.) Ny Ellebjerg (inkl.) – Ryparken (ekskl.)	Nyt signalsystem S-banen	Ibrugtagning af "postponed deliveries"	1 weekend	Marts	25/3. – 27/3	Totalspærring	Banedanmark	x
2	820	Hellerup spor 3, 4, 5 og 6	Køreledning Østerport – Holte	Udskiftning af køreledningsanlæg	7 døgn	Efterårsferien	15/10 – 22/10	Enkeltsporsdrift Svanemøllen – Hellerup – Gentofte Og Lersøen – Hellerup – Klampenborg	Banedanmark	x
3	820	Hellerup spor 7 og 8	Køreledning Østerport – Holte	Udskiftning af køreledningsanlæg	2 weekender	Oktober – December	Ukendt	Enkeltsporsdrift Gentofte – Hellerup – Svanemøllen Og Klampenborg – Hellerup – Lersøen	Banedanmark	x
4	820	Gentofte spor 1 og 2	Køreledning Østerport – Holte	Udskiftning af køreledningsanlæg	1 weekend	Juli – September	Ukendt	Totalspærret Hellerup – Lyngby Togbusser	Banedanmark	x
5	820	Gentofte (inkl.) – Sorgenfri (inkl.)	Køreledning Østerport – Holte	Udskiftning af køreledningsanlæg	4 døgn	Påsken	6/4 – 10/4	Totalspærring Gentofte – Sorgenfri	Banedanmark	x
6	840	Vangede (ekskl.) – Stengården (ekskl.)	Letbanen ved Buddinge	Etablering af trugkonstruktion i Buddinge	10 døgn	Påsken	31/3 – 11/4	Totalspærring ml. Vangede og Stengården. Der kan vendes tog på de to stationer	3. part	x
7	850	Køge station	Renovering af vej bærende bro Københavnsvej	Betonreparationer m.m.	4 weekender	Sommer	Ukendt	Totalspærring af Køge station S-Banen.	Banedanmark	x
8	830	Herlev (inkl.) – Ballerup (inkl.)	UF af stiftorbindelse, Herlev	Udførelse af spor bærende broanlæg (stittunnel) med integreret skybrudsledning, bro 14462, km. 13,035	4X24+7 = 103 t	Juli 2023	5/7 – 10/7	Totalspærring af begge S-spor	Herlev Kommune i samarbejde med HOFOR	x
9	880	Ny Ellebjerg (inkl.)	Metroprojektet	Tilbagelægning af spor 11 og 12	1 måned	Oktober 2023	Oktober 2023	Totalspærring	Metroselskabet	x
